

深圳市治理深圳河办公室

治理深圳河第三期第二阶段合同 C 工程

环境监察与审核月报

2006 年第七期 2006 年 7 月



总第 28 期

长江水资源保护科学研究所

二〇〇六年八月

目 录

1 执行概要	1
1.1 简介	1
1.2 空气	1
1.3 噪音	1
1.4 水质	2
1.5 废物管理	3
1.6 工地巡察	3
1.7 投诉	3
2 工程概况	4
3 空气	7
3.1 监察项目、点位及频率	7
3.2 监察仪器与监察方法	7
3.3 监察结果	7
3.4 审核	8
4 噪音	14
4.1 监察项目、点位及频率	14
4.2 监察仪器与监察方法	14
4.3 监察结果	15
4.4 审核	16
5 水质	20
5.1 监察点位、项目和频率	21
5.2 分析方法与监察仪器	24
5.3 监察结果	25
5.4 审核	27
6 结论与建议	39
7 下月工程施工与环境监察计划	40
7.1 下月工程施工计划	40
7.2 下月环境监察计划	40

1 执行概要

1.1 简介

治理深圳河第三期工程的主要目的是防洪。治理深圳河第三期第二阶段工程划分为三个合同段，合同 C 工程（简称 III C 工程）段位于 A、B 工程上游河段，下游与第三期第二阶段合同 B 工程相连，上游至第三期第二阶段工程终点平原河口，河道中心轴线起止里程为 11+800.000 至 13+558.733，河道长度 1759m。合同 C 工程主要工程项目包括河道工程、堤防工程、重配工程、东深供水管线改建工程、沙石皮带设施重建工程 and 环境保护工程。受深圳市治理深圳河办公室委托，长江水资源保护科学研究所组成治理深圳河第三期合同 C 工程环境监察与审核小组（以下简称环监小组），对工程的施工环境影响进行监察。

本报告期环监小组继续在 III C 工程施工区深圳侧华侨新村空气和噪音监察点进行施工期空气和噪音监察；继续在香港侧木湖村和瓦窑村分别设立空气、噪音监察点，对施工期空气和噪音进行监察。继续在平原河口（Mcc）、文锦渡（Mbc）、鹿丹村点（MI）和深圳河口（MII）设置 4 个水质监察点，对深圳河实施水质监察；继续对工程水下疏浚实施水质监察。同时，对工程废物管理和水质污染控制以及施工区的景观与视觉、水土保持、生态保护，以及相关环境保护纾缓措施的实施及效果进行现场监察。本报告期 III C 工程实施非污染土海上弃置转运场弃土转运施工，环监小组根据批准的《非污染土海上弃置转运水质监察方案》，继续进行非污染土海上弃置转运场水质监察。

按《环监手册》要求，本报告期无观鸟任务，未进行鸟类观测。

本期月报为 2006 年 7 月 1 日至 2006 年 7 月 31 日 III C 工程的环境监察与审核。

1.2 空气

深圳侧：

本报告期在深圳侧华侨新村监察点共进行了 4 次 24 小时平均 TSP 监察，时间分别为 7 月 4 日、11 日、18 日和 25 日至次日。4 次 24 小时平均 TSP 的监察结果在 $35.6\sim 175\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之间，均低于深圳侧的空气监察启动水平（ $260\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）。

本报告期深圳华侨新村监察点 24 小时平均 TSP 监察结果，均低于深圳侧空气监察启动水平。因此，未采取相应的行动。

香港侧：

本报告期于 7 月 4 日、11 日、18 日和 25 日至次日分别在香港侧瓦窑村和木湖村空气监察点各进行了 4 次 24 小时平均 TSP 监察。瓦窑村监察点 4 次 24 小时平均 TSP 监察的结果在 $23.7\sim 36.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之间，木湖村监察点 4 次 24 小时平均 TSP 监察的结果在 $21.4\sim 60.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之间，均低于香港侧的空气监察启动水平（ $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）。

本报告期香港侧瓦窑村和木湖村监察点 24 小时平均 TSP 监察结果，均低于香港侧空气监察启动水平，因此，未采取相应的行动。

1.3 噪音

深圳侧：

本报告期环监小组分别于 7 月 4 日、5 日、11 日、12 日、18 日、19 日、25 日和 26 日昼间，在深圳侧华侨新村监察点进行了 8 次等效噪音声级 $\text{Leq}(30\text{min})$ 的监察。本报告期深圳华侨新村监察点昼间噪音声级 $\text{Leq}(30\text{min})$ 在 $57.4\sim 65.0\text{dB}(\text{A})$ 之间，8 次监测结果均超出了基线范围最大值。

本报告期环监小组接到 1 起有关 III C 工程深圳侧工地施工噪音扰民投诉，环监小组依照《治理深圳河

第三期工程环境监察与审核手册》规定，采取了相应的行动计划。

香港侧：

本报告期环监小组于 7 月 4 日、5 日、11 日、12 日、18 日、19 日、25 日和 26 日昼间，分别在香港侧瓦窑村和木湖村噪声监察点进行了 8 次等效噪音声级 $Leq(30min)$ 的监察。

本报告期瓦窑村监察点昼间噪音声级 $Leq(30min)$ 在 53.4~58.4dB(A) 之间，8 次监测结果有 5 次在基线范围内，另 3 次超出了基线范围最大值，但均未超过香港侧的噪音监察启动水平，也未收到工程噪音扰民的投诉；木湖村监察点昼间噪音声级 $Leq(30min)$ 在 49.2~56.4dB(A) 之间，8 次监测结果 2 次在基线范围内，另有 6 次超出了基线范围最大值，但均未超过香港侧的噪音监察启动水平，也未收到工程噪音扰民的投诉，因此，没有采取与启动、行动、极限（TAL）水平相应的行动。

1.4 水质

本报告期承建商在桩号 12+500~12+750 段进行水下疏浚。环监小组共进行了 8 次水下疏浚水质监察，并于 2006 年 7 月 14 日在深圳河 4 个固定水质监察点采集河水样本，进行了 1 次长周期多参数水质监察。

本报告期承建商继续在深圳湾非污染土海上弃置转运场进行弃置转运作业。本报告期环监小组共进行了 4 天非污染土海上弃置转运场短周期水质监察，其中包括 2006 年 7 月 13 日在非污染土海上弃置转运场 6 个水质监察点采集海水样本，进行每月 1 天的长周期水质监察。

1) 深圳河

本报告期平原河口水质监察点涨潮期和落潮期 SS 值分别为 5.72mg/L 和 33.3mg/L，文锦渡水质监察点涨潮期和落潮期 SS 值分别为 15.6mg/L 和 14.4mg/L，对比这两个监察点的 SS 含量，涨潮期文锦渡水质监察点比平原河口水质监察点增加了 172%，落潮期文锦渡水质监察点比平原河口水质监察点减少了 56.8%。

与上一个报告期相比，平原河口水质监察点涨潮期 SS 含量由 49.1mg/L 下降至 5.72mg/L，落潮期 SS 含量由 106mg/L 下降至 33.3mg/L；文锦渡水质监察点涨潮期 SS 含量由 36.8mg/L 下降至 15.6mg/L，落潮期由 37.0mg/L 下降至 14.4mg/L。

本报告期深圳河鹿丹村固定水质监察点和深圳河口永久水质监察点 SS 含量在 33.2~92.7mg/L 之间，最大值出现在深圳河口水质监察点涨潮期，最小值出现在鹿丹村水质监察点落潮期。与上一个报告期相比，鹿丹村水质监察点涨潮期 SS 含量由 75.8mg/L 下降为 49.2mg/L，落潮期由 34.0mg/L 下降至 33.2mg/L；深圳河口水质监察点 SS 含量涨潮期由 35.3mg/L 上升至 92.7mg/L，落潮期由 22.1mg/L 上升至 79.8mg/L。

2) 深圳湾海上弃置转运场

本报告期共进行了 4 天每周 1 次的非污染土海上弃置转运场水质监察，涨潮期和落潮期控制点 SS 含量在 14.2mg/L~47.8mg/L 之间，涨潮期和落潮期均未超过控制标准。

与上一个报告期相比，本报告期非污染土海上弃置转运场出入口水质监察点涨潮期 SS 含量由 21.8mg/L 下降至 18.5mg/L，落潮期 SS 含量由 46.0mg/L 下降至 40.8mg/L；主航道水质监察点涨潮期 SS 含量由 22.7mg/L 上升为 26.2mg/L，落潮期 SS 含量由 35.1mg/L 上升为 43.1mg/L。

其它主要水质参数

本报告期深圳河水质比上一个报告期有所好转，溶解氧（DO）含量在平原河水水质监察点涨潮期为 2.91mg/L，落潮期为 4.38mg/L；文锦渡水质监察点涨潮期为 2.27mg/L，落潮期为 2.63mg/L；鹿丹村水质监察点涨潮期为 1.86mg/L，落潮期为 1.62mg/L；深圳河口水质监察点涨潮期为 4.47mg/L，落潮期为 4.05mg/L。

与上一报告期相比，本报告期鹿丹村水质监察点主要水质参数平均值变化如下：BOD₅ 由 17.2mg/L 上升为 33.0mg/L；氨氮由 16.3mg/L 下降至 13.2mg/L；总氮由 20.3mg/L 下降至 18.7mg/L；总磷由 1.13mg/L 上升为 1.68mg/L；总铜由 18.4μg/L 上升为 22.4μg/L。

与上一个报告期相比，本报告期深圳河河口水质监察点主要水质参数平均值变化如下：BOD₅ 由

2.85mg/L 上升为 9.70mg/L；氨氮由 12.2mg/L 下降至 5.90mg/L；总氮由 14.8mg/L 下降至 6.67mg/L；总磷由 0.53mg/L 上升为 0.79mg/L；总铜由 4.2 μ g/L 上升为 19.1 μ g/L。

本报告期深圳河水质监察控制点 SS 含量均未超过相应水平规限，因此环监小组未启动相关行动计划。

1.5 废物管理

本报告期 III C 工程废物主要是深圳河 III C 工程段基础开挖料，均为非污染土。

经工程主任认可，承建商将部分非污染土开挖料运至西丽余泥渣土受纳场，部分经深圳湾海上弃置转运场弃置于黄茅岛弃土场。承建商继续执行工程有关废物管理的规定，按废物管理计划要求，进行弃土转运及弃置，进行工区建筑废料清除、清理杂物、平整地面等工作。

1.6 工地巡察

本报告期环监小组于 7 月 3 日、4 日、5 日、10 日、11 日、12 日、17 日、18 日、19 日、24 日、25 日、26 日和 31 日到 III C 工地进行现场巡察，重点对工地噪音防护、河道水文水质情况、扬尘控制、水土保持和工地景观等进行了检查和督促。本报告期 III C 工程陆上施工作业强度较小，工区起尘现象较轻，并且受“碧利斯”和“格美”台风影响，本报告期出现有较多的阴雨天气，对抑制施工扬尘、降低空气中粉尘含量及净化空气起到一定作用，工区的环境空气质量状况良好。本报告期承建商继续对外出工地进入市政道路的车辆做好冲洗除尘工作。

本报告期 III C 工程段噪音源主要为河道水下疏浚开挖、河道防护工程等施工机械、车辆和船舶噪音，对区域声环境产生一定干扰，由于 III C 工区施工场地开阔、机械使用分散、以及两岸已完建河堤的屏障作用，施工噪音对大部分区域未产生较大干扰；在沙湾河口及下游施工场区，承建商加强了施工管理和噪音控制，本报告期噪音污染程度有所降低，对附近深圳侧居民生活干扰有所减轻。

本报告期承建商继续在 III C 工程河段进行水下疏浚开挖，水下疏浚施工对深圳河水体局部产生一定影响。受“碧利斯”和“格美”台风影响，本报告期出现了较大、较长的阵雨天气和雷暴雨天气，使得平原河上游河段受强降雨冲刷，水土流失较为严重，期间造成河水中夹带大量泥沙，河水明显混浊，水体呈深黄色，泥沙在下游河道造成一定淤积。

本报告期环监小组于 7 月 6 日、13 日、20 日和 28 日在深圳湾海上弃置转运场进行了现场巡察，未发现转运场弃置转运施工明显影响转运场水域水体感观的情况。转运场自投入使用以来，经受转运施工作业及潮流冲击等外部环境因素影响，转运场设施受到一定影响和损坏，环监小组及时将情况通知承建商，要求承建商尽快修复完善，并做好日常维护工作。承建商对问题给予了积极的回应，将尽快采取措施予以修复。

本报告期因强降雨天气，环监小组在工地巡察时发现多处施工主干道路面损坏较为严重，影响工地景观和场内交通，环监小组及时通知承建商，要求承建商在雨后对施工道路进行了抢修和维护，保护工地景观和道路畅通，承建商对问题给予积极的重视，组织工人对坑洼、泥泞路面进行排水清理，并铺洒碎石，问题得到较好的解决。

1.7 投诉

本报告期环监小组于 7 月 27 日共接到 1 起有关 III C 工程深圳侧施工噪音扰民投诉，根据《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》，环监小组接到投诉后，当即通告承建商，要求立即查明施工噪音扰民的原因，并提出可行的纾缓措施。

经调查，本报告期的这起噪音投诉主要是由于承建商在文锦渡施工区进行施工作业，影响了附近居民的正常生活。环监小组当即要求承建商采取明确有效的降噪措施，严格控制施工时段，采取措施减轻噪音污染。承建商积极回应，对投诉事件进行了及时的处理和回访，并制订较详细的噪音纾缓措施，严格控制施工作业时间，避免施工噪音扰民。

2 工程概况

治理深圳河第三期第二阶段合同 C 工程段轴线范围自桩号 11+800.000 至 13+558.733，河道长度 1759m。在合同 C 河段主体工程包括：1) 河道工程、2) 堤防工程、3) 东深供水管线改造工程、4) 重配工程、5) 环境保护工程。合同 C 工程平面布置见图 2-1。

承建商在本工程月进行的主要工程项目为 L 型挡土墙施工、土方开挖与回填、河道防护工程、排水重配工程分项工程施工。与环境影响相关的工程项目完成量和进展情况参见表 2-1。

表 2-1 主要工程项目工程量统计表

序号	项目名称	施工情况与工程进展
1	主体工程 A 深圳侧 L 型挡土墙施工	完成 2 段挡墙，累计完成 197 段，占总数的 95.2%，完成 C30 砼浇筑 80 m ³ ，累计完成 8337.60m ³ ，占总量的 96%。
2	地连墙工程	主墙全部完成。累计完成 0.8m 厚 148.9 延米，1.2m 厚 365.3 延米，共完成 514.2 延米，C30 砼灌注累计完成 7343.69 m ³ 。
3	主体工程 B 南岸挡土墙施工	全部完成南岸 164 段挡墙，累计完成 C40 砼浇筑 3950.248 m ³ 。
4	排水重配工程	完成南岸 2#、3#、4#、5# 排水涵土建部分；北岸 7#、9#、10#、11#、12# 排水涵全部完成，完成北岸 U 型排水沟施工 480 米，完成南岸 U 型排水沟施工 300 米。
5	土方工程	累计完成土方开挖 88 万方，占总量的 96.7%；累计完成土方弃置 76 万方，占总量的 97.3%。土方回填完成 12 万方，占总量的 93%。
6	河道防护工程	完成桩号 12+300 至桩号 12+600 段南北岸河道碎石铺设 4000 方，累计完成 21000 方，占总量的 49.4%；完成块石施工 19800 方，累计完成 40000 方，占总量的 55%。
7	绿化工程	完成南岸草皮砼铺设 2200 m ² ，累计完成 9200 m ² ，占总量的 24.4%。


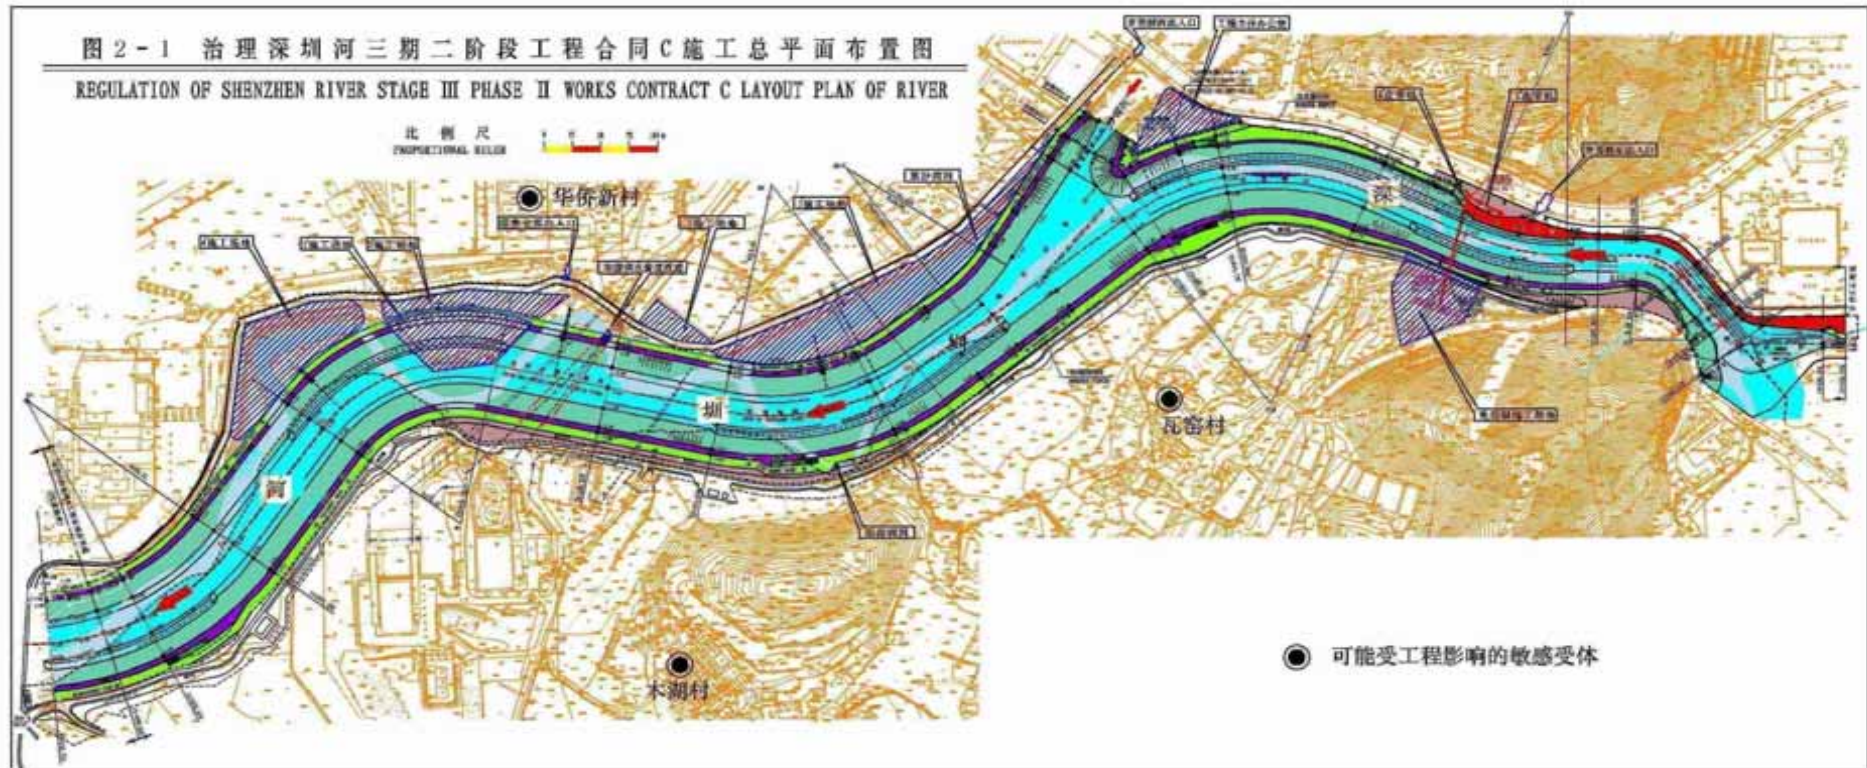


图 3-1 治理深圳河三期第二阶段工程合同C空气监察点位置

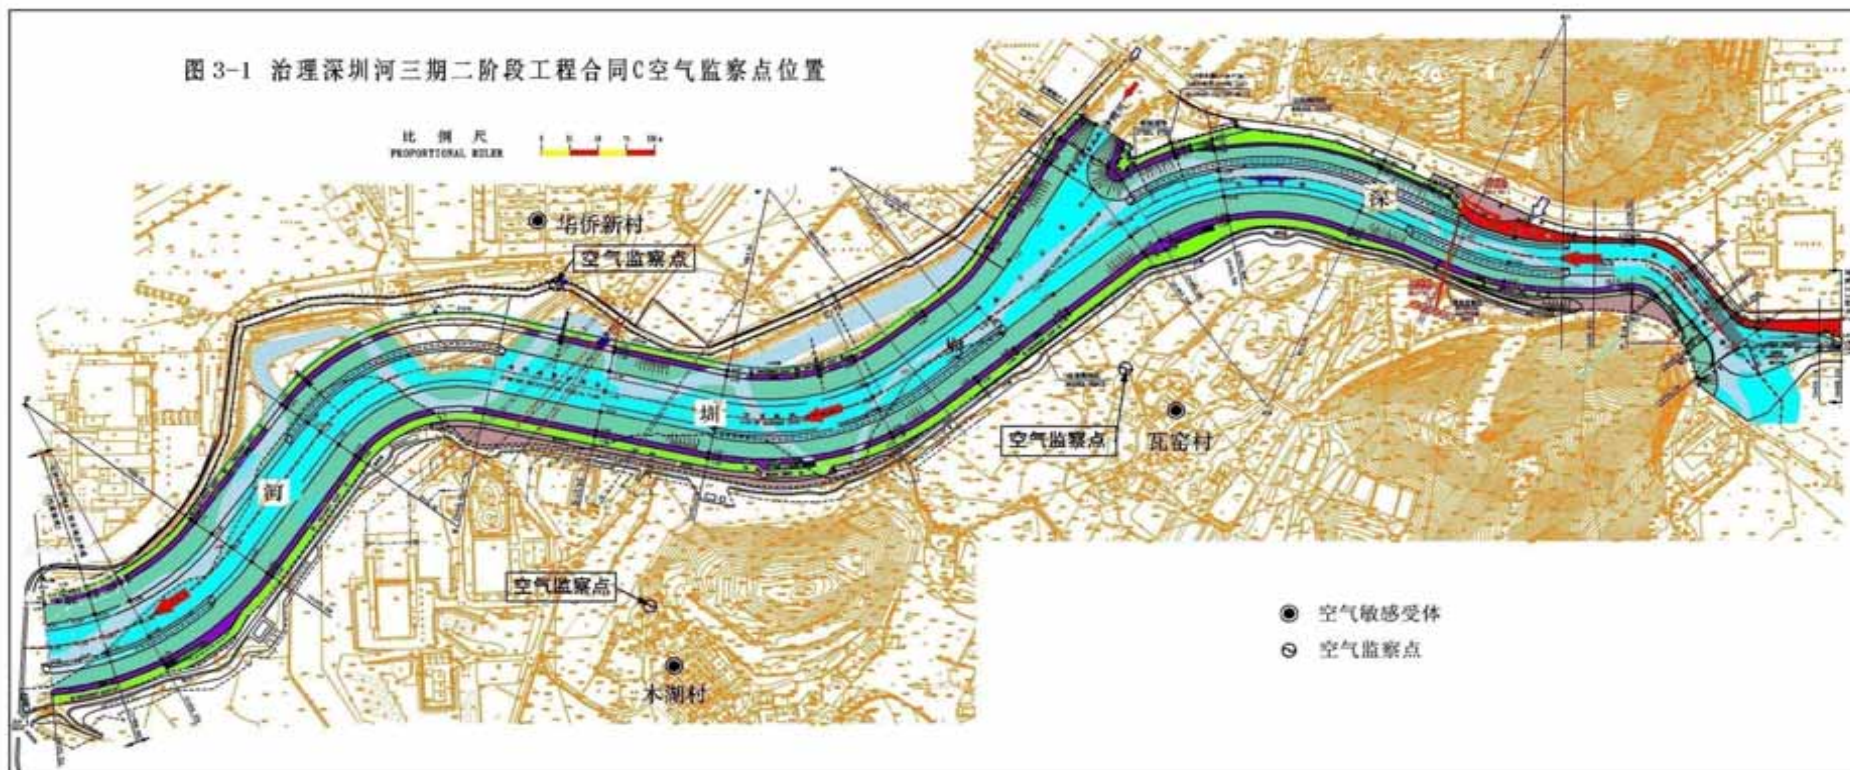

3 空气

3.1 监察项目、点位及频率

监察项目：24 小时平均总悬浮颗粒物 (24 小时平均 TSP)。

监察点位：治理深圳河 III C 工程在深圳侧华侨新村设 1 个空气监察点，位于三岔河口下游约 160m 深圳边防巡逻道路傍边境围网内，距深圳河约 30 米左右，主要监测华侨新村空气敏感受体空气质量受工程影响的情况。香港侧空气监察点分别设在香港瓦窑村和木湖村。木湖村空气监察点位于木湖村附近，距离工地 127m；瓦窑村空气监察点位于瓦窑村附近，距离工地 108m，分别监测木湖村和瓦窑村敏感受体空气质量受工程影响的情况。治理深圳河 III C 工程空气监察点位置见图 3-1。

监察频率：根据《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》要求，本报告期环监小组于 7 月 4 日、11 日、18 日和 25 日至次日，在深圳侧华侨新村监察点进行了 4 次每周一次的 24 小时平均 TSP 监察；于 7 月 4 日、11 日、18 日和 25 日至次日，在香港侧瓦窑村和木湖村监察点分别进行了 4 次每周一次的 24 小时平均 TSP 空气监察。

3.2 监察仪器与监察方法

3.2.1 仪器及校准

24 小时平均 TSP 监测采用美国 Graseby 公司生产的 GS2310 型大流量空气采样系统，流量校准采用 G2535 型孔板校准器，每 3 个月按照该仪器的说明书校准一次；在更换电机或电刷后重新进行流量校准。校准程序按气阻板号：18、13、10、7、5 系列进行，同时分别记录各气阻板压差计测量值 (H) 和流量计测量值 (I)，计算并作出“流量校准曲线”，控制其相关系数 ≥ 0.99 。滤膜称量采用灵敏度为 0.01mg 的德国产 BP211D 型电子天平，由深圳计量测试所进行检定，取得计量测试合格证书后使用。

3.2.2 监察方法

24 小时 TSP 采用重量法进行测定，采用特制玻璃纤维滤膜抽滤空气中的总悬浮颗粒物。大流量空气采样系统的流量，控制在 $1.1\sim 1.7\text{m}^3/\text{min}$ 范围内，采样时间控制在 24 ± 0.5 小时。大流量空气采样系统的操作（或分析）程序及维护均按仪器使用说明书进行。

在采样前后，玻璃纤维滤膜先置于 $103\pm 2^\circ\text{C}$ 的烘箱内烘烤 1.5 小时，然后放在干燥器内平衡 0.5 小时后称重。天平室温度维持在 $15\sim 35^\circ\text{C}$ 之间，相对湿度小于 60%。

3.3 监察结果

本报告期环监小组在深圳侧华侨新村进行了 4 次 24 小时平均 TSP 监察，在香港侧瓦窑村和木湖村分别进行了 4 次 24 小时平均 TSP 监测，结果见表 3-1。

表 3-1 2006 年 7 月治理深圳河第三期合同 C 工程空气质量 (24hr 平均 TSP) 监察结果

监察 点位	监察日期 yy-mm-dd	天气状况	滤膜重量(g)		流量(m^3/min)		采样起止码(hrs)		浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
			开始	结束	开始	结束	开始	结束	
华 侨 新	06-07-04	阴有阵雨	2.6864	2.7676	1.55	1.55	3554.81	3579.27	35.6
	06-07-11	阴有阵雨	2.6889	2.7782	1.55	1.55	3579.27	3603.10	40.2
	06-07-18	晴	2.6539	2.8062	1.55	1.55	3616.02	3639.97	68.3
	06-07-25	多云	2.6772	3.0322	1.44	1.44	3639.97	3663.50	175

表 3-1 2006 年 7 月治理深圳河第三期合同 C 工程空气质量 (24hr 平均 TSP) 监察结果

监察 点位	监察日期	天气状况	滤膜重量(g)		流量(m ³ /min)		采样起止码(hrs)		浓度 (μg/m ³)
	yy-mm-dd		开始	结束	开始	结束	开始	结束	
新 村	平均值								79.8
	最大值								175
	最小值								35.6
	06-07-04	阴有阵雨	2.6886	2.7362	1.37	1.37	1903.96	1928.46	23.7
香 港 瓦 窑 村	06-07-11	阴有阵雨	2.6673	2.7286	1.37	1.37	1928.46	1952.21	31.4
	06-07-18	晴	2.6735	2.7438	1.37	1.37	1952.21	1975.94	36.1
	06-07-25	多云	2.6585	2.7202	1.37	1.37	1975.94	1999.06	32.6
	平均值								31.0
	最大值								36.1
	最小值								23.7
	06-07-04	阴有阵雨	2.6794	2.7186	1.23	1.23	8865.74	8890.42	21.4
香 港 木 湖 村	06-07-11	阴有阵雨	2.6613	2.7091	1.24	1.24	8890.42	8914.27	27.0
	06-07-18	晴	2.6568	2.7127	1.23	1.23	8914.27	8937.93	31.9
	06-07-25	多云	2.6598	2.7180	1.23	1.23	8937.93	8951.03	60.0
	平均值								35.1
	最大值								60.0
	最小值								21.4

3.4 审核

3.4.1 启动、行动和极限(TAL)水平及行动计划

根据《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》的规定,治理深圳河第三期合同 C 工程空气监察的启动、行动和极限三个水平的定义见表 3-2。相应的行动计划见表 3-3。

表 3-2 深港两侧空气监察的启动、行动和极限水平规限

水 平	深圳侧 (μg/m ³)	香港侧 (μg/m ³)
启动水平	24 小时 TSP: 260	24 小时 TSP: 200
行动水平	24 小时 TSP: 310	24 小时 TSP: 230
极限水平	24 小时 TSP: 360	24 小时 TSP: 260, 1 小时 TSP: 500

表 3-3 IIIIC 工程建造期空气监察行动计划

事 件		行 动 计 划		
		环境监察审核小组	雇 主	承 建 商
平 启 动 水	一个以上样品超标	1.鉴别污染源 2.通知雇主 3.复查超标样品结果	1.通报承建商 2.核查监察资料 3.检查承建商工作方法	1.更正不当作业方式 2.如果必要,改变施工方法

表 3-3 III C 工程建造期空气监察行动计划

事 件		行 动 计 划		
		环境监察审核小组	雇 主	承 建 商
行 动 水 平	A. 一个样品超标	同启动水平, 另增加: 1. 增加监察频率	同启动水平	同启动水平
	B. 两个以上样品连续超标	同行动水平 A, 并增加: 1. 与雇主商讨必要的补救措施 2. 如果继续超标, 与雇主一起开会讨论 3. 如果超标停止, 恢复正常监察频率	1. 拟定书面通知单并通告承建商 2. 核查监察资料并检查承建商的工作方法 3. 与环境监察审核组长、工程主任及承建商商讨可能的补救措施 4. 确保合适的补救措施的实施	1. 接到雇主通告 3 个工作日内向雇主提交补救措施建议 2. 实施被批准的建议措施 3. 如果必要, 修订所建议的补救措施
极 限 水 平	A. 一个样品超标	1. 识别污染源 2. 通知雇主及深圳市环保局和香港环保署 3. 复查超标样品结果 4. 增加监察频率 5. 评估承建商补救措施的有效性, 将其结果通知深圳市环保局和香港环保署	1. 拟定书面通知单并通告承建商 2. 核查监察资料并检查承建商的工作方法 3. 与环境监督审核组长、工程主任及承建商商讨可能的补救措施 4. 确保补救措施有效地实施	1. 立即采取措施, 以免继续超标 2. 同行动水平 B 的 1、2、3 条款
	B. 两个以上样品连续超标	同极限水平 A 的 1、3、4、5 条款, 另增加: 1. 将超标原因及所采取的行动通知雇主及深圳市环保局和香港环保署 2. 调查超标原因 3. 与雇主及深圳环保局和香港环保署召开协调会, 共同商讨拟实施的补救措施 4. 如超标停止, 恢复正常监察	同极限水平 A 的 1、2 条款, 另增加: 1. 分析承建商的工作程序, 确定可能实施的纾缓措施 2. 召集环境监察审核组长、工程主任及承建商商讨补救措施 3. 随时监督承建商补救措施的实施, 以确保其有效性 4. 如继续超标, 则对工程活动加以分析, 责令承建商停止引起超标的工程活动, 直至达标为止	同极限水平 A 的 1、2、3, 条款另增加: 1. 如果超标仍未得到控制, 重新提交补救措施建议 2. 停止雇主决定的有关工程活动, 直至达标为止

3.4.2 空气质量状况

深圳华侨新村:

本报告期在深圳侧华侨新村空气监察点共进行了 4 次 24 小时平均 TSP 监察, 时间分别为 7 月 4 日、11 日、18 日和 25 日至次日, 4 次 24 小时平均 TSP 的监察结果在 35.6~175 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之间。本报告期 III C 工程施工主要是河道水下疏浚开挖和河道防护工程, 开挖产生的弃土绝大部分以水运外弃方式处理, 陆上施工作业较少。受“碧利斯”和“格美”台风影响, 本报告期阴雨天气有较多, 对抑制施工区起尘、净化空气起到一定作用, 施工区环境空气质量良好。华侨新村监察点 24 小时平均 TSP 变化趋势见图 3-2。如图所示, 本报告期华侨新村 4 次 TSP 监测水平虽呈逐次递增趋势, 但各次的水平值均不大, 最大水平也仅为 25 日的 175 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 低于深圳侧空气监察启动水平。

深圳侧华侨新村空气监察点 24 小时平均 TSP 基线监察结果在 74.7~111 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之间, 本报告期华侨新村空气监察点 4 次 24 小时平均 TSP 监察结果有 3 次低出基线范围, 另有 1 次超出了基线范围。本报告期华侨新村空气监察点 24 小时平均 TSP 监察结果的平均值为 79.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 低于基线监察结果的平均值 (85.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), 也低于上一个报告期的平均值 (85.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$); 最大值为 175 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 高于基线监察结果的最大值 (111 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), 也高于上一个报告期的最大值 (122 $\mu\text{g}/\text{m}^3$); 最小值为 35.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 低于基线监察结果的最小值 (74.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), 也低于上一个报告期的最小值 (59.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)。本报告期 III C 工程深圳侧华侨新村监察点空气质量优于基线监察时期的空气质量水平, 也优于上一个报告期。

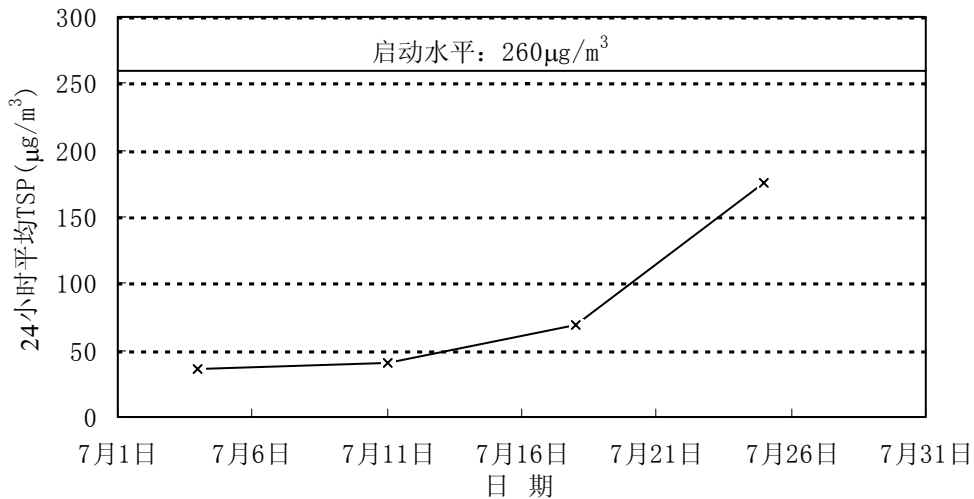


图3-2 2006年7月华侨新村监察点24小时平均TSP变化趋势

本报告期深圳侧华侨新村监察点 24 小时平均 TSP 监察结果均低于深圳侧空气监察水平规限 ($260\mu\text{g}/\text{m}^3$)，因此没有采取与启动、行动、极限 (TAL) 水平相应的行动。

香港瓦窑村:

本报告期在香港瓦窑村空气监察点共进行了 4 次 24 小时平均 TSP 监察，时间分别为 7 月 4 日、11 日、18 日和 25 日至次日。4 次 24 小时平均 TSP 的监察结果在 $23.7\sim 36.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之间。本报告期IIIC 工程香港瓦窑村工程段施工作业强度较低，受“碧利斯”和“格美”台风影响，本报告期阴雨天气较多，对净化空气起到一定作用，施工区空气中粉尘含量明显降低。本报告期香港瓦窑村监察点 24 小时平均 TSP 变化趋势见图 3-3。如图所示，本报告期瓦窑村监察点的 4 次 TSP 监测结果均低于 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，环境空气质量状态良好。

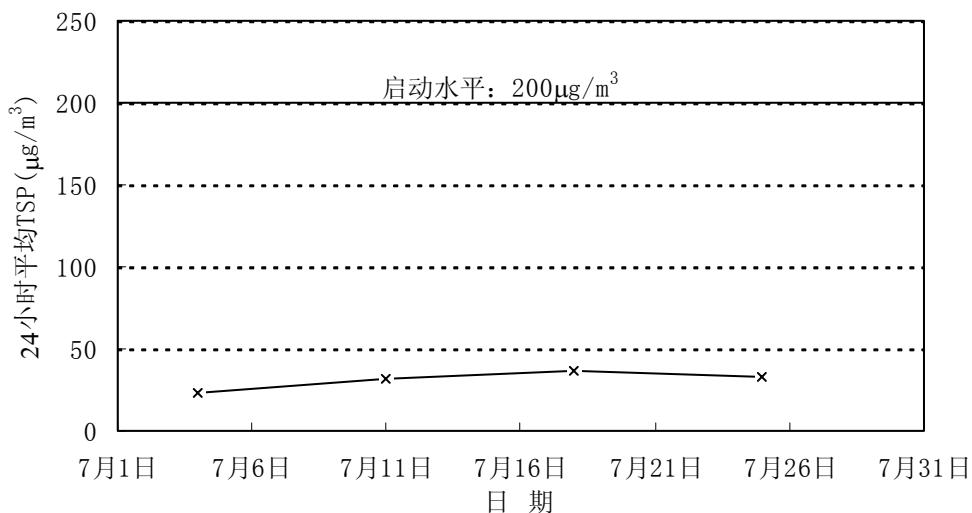


图3-3 2006年7月瓦窑村监察点24小时平均TSP变化趋势

香港瓦窑村空气监察点 24 小时平均 TSP 的基线监察结果在 $37.1\sim 178\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之间，本报告期瓦窑村监察点 4 次 24 小时平均 TSP 监察结果均低出基线范围。本报告期瓦窑村空气监察点 24 小时平均 TSP 监察结果的平均值为 $31.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，低于基线监察结果的平均值 ($96.1\mu\text{g}/\text{m}^3$)，但高于上一个报告期的平均值 ($25.4\mu\text{g}/\text{m}^3$)；最大值为 $36.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，低于基线监察结果的最大值 ($178\mu\text{g}/\text{m}^3$)，和上一个报告期的最大值

($36.1\mu\text{g}/\text{m}^3$) 持平; 最小值为 $23.7\mu\text{g}/\text{m}^3$, 低于基线监察结果的最小值 ($37.1\mu\text{g}/\text{m}^3$), 但高于上一个报告期的最小值 ($20.2\mu\text{g}/\text{m}^3$)。本报告期香港瓦窑村监察点空气质量优于基线监察时期, 但差于上一个报告期。

香港木湖村

本报告期于 7 月 4 日、11 日、18 日和 25 日至次日, 在香港木湖村空气监察点共进行了 4 次 24 小时平均 TSP 监察, 4 次 24 小时平均 TSP 的监察结果在 $21.4\sim 60.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之间。本报告期 IIC 工程香港木湖村工程段施工作业强度低, 并且受“碧利斯”和“格美”台风影响, 本报告期阴雨天气较多, 对净化空气起到一定作用, 空气中的粉尘含量明显降低。香港木湖村空气监察点 24 小时平均 TSP 变化趋势见图 3-4。如图所示, 本报告期木湖村监察点的 4 次 TSP 监测结果虽呈逐次递增的变化趋势, 但各次的水平值均很低, 最大水平也仅为 $60\mu\text{g}/\text{m}^3$, 另三次的监测结果均在 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下, 环境空气质量状态良好。

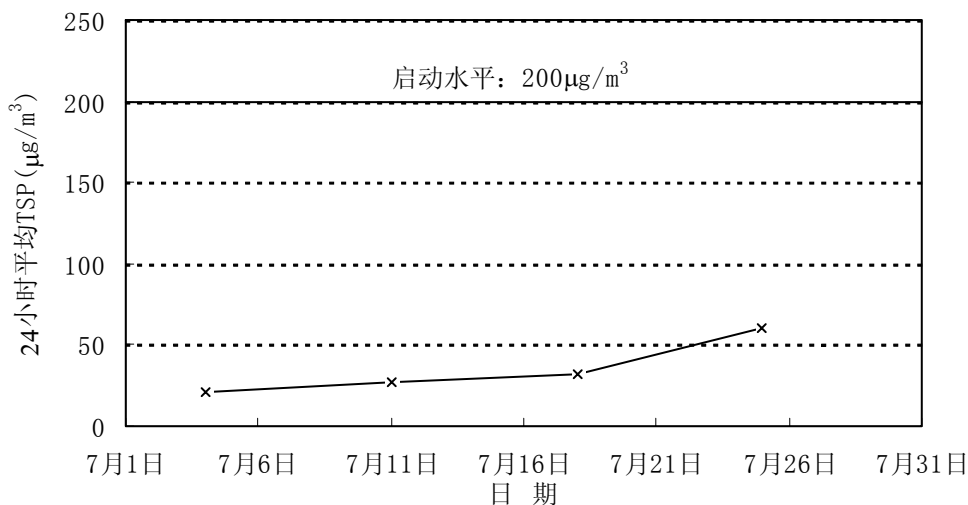


图3-4 2006年7月木湖村监察点24小时平均TSP变化趋势

本报告期香港木湖村空气监察点 24 小时平均 TSP 的基线监察结果在 $50.5\sim 152\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之间, 4 次 24 小时平均 TSP 监察结果 3 次低出基线范围, 1 次在基线范围内。本报告期木湖村空气监察点 24 小时平均 TSP 监察结果的平均值为 $35.1\mu\text{g}/\text{m}^3$, 低于基线监察结果的平均值 ($93.1\mu\text{g}/\text{m}^3$), 但高于上一个报告期的平均值 ($26.7\mu\text{g}/\text{m}^3$); 最大值为 $60.0\mu\text{g}/\text{m}^3$, 低于基线监察结果的最大值 ($152\mu\text{g}/\text{m}^3$), 但高于上一个报告期的最大值 ($33.1\mu\text{g}/\text{m}^3$); 最小值为 $21.4\mu\text{g}/\text{m}^3$, 低于基线监察结果的最小值 ($50.5\mu\text{g}/\text{m}^3$), 也低于上一个报告期的最小值 ($22.6\mu\text{g}/\text{m}^3$)。本报告期香港木湖村监察点空气质量优于基线监察时期, 但要差于上一个报告期。

本报告期香港侧瓦窑村和木湖村空气监察点 24 小时平均 TSP 监察结果均低于香港侧空气监察水平规范 ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$), 因此没有采取与启动、行动、极限 (TAL) 水平相应的行动。

3.4.3 24 小时平均 TSP 趋势分析

深圳华侨新村

深圳华侨新村空气监察点 2006 年 4 月至 7 月 24 小时平均 TSP 变化趋势见图 3-5。如图所示, 在过去四个报告期, 深圳华侨新村空气监察点 TSP 含量从 4 月份开始, 平均值呈递减趋势, 虽然本报告期的最大值水平虽较上一个报告期有较大幅度的上升, 但仍低于 4 月和 5 两个月水平, 也低于深圳侧工程施工空气监察的启动水平, 且最小值降至过去四个报告期的最低值。总体而言, 自 4 月份进入雨季以来, 阴雨天气明显增多, 对抑制施工扬尘、降低空气中的粉尘含量起到一定作用, 且本报告期 IIC 工程施工以水下作业和水上运输为主, 工区起尘现象较轻, 对环境空气质量影响不大, 在过去四个报告期深圳华侨新村空气监察环境空气质量良好。

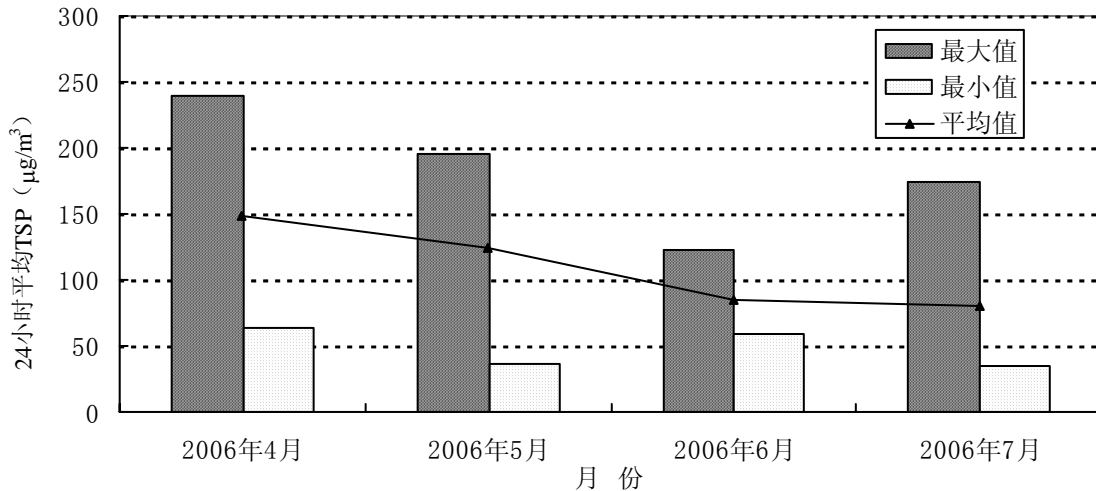


图3-5 2006年4月至7月华侨新村监察点24小时TSP变化趋势

香港瓦窑村

香港瓦窑村空气监察点 2006 年 4 月至 7 月的 24 小时平均 TSP 变化趋势见图 3-6。如图所示，过去四个报告期香港瓦窑村监察点 TSP 空气污染程度均处在较低的水平，本报告期均值水平虽然结束了过去连续三个报告期的递减变化，较上一个报告期有所上升，但其最大值指标继 5 月、6 月两个报告期后连续三个报告期的最大值水平在 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下。总体而言，自 4 月份进入雨季以来，阴雨天明显增多，对抑制地面起尘，降低空气中的粉尘含量起到一定作用，工程施工对香港瓦窑村空气监察点的扬尘影响很轻，在过去四个报告期香港瓦窑村空气监察点环境空气质量状况均属良好。

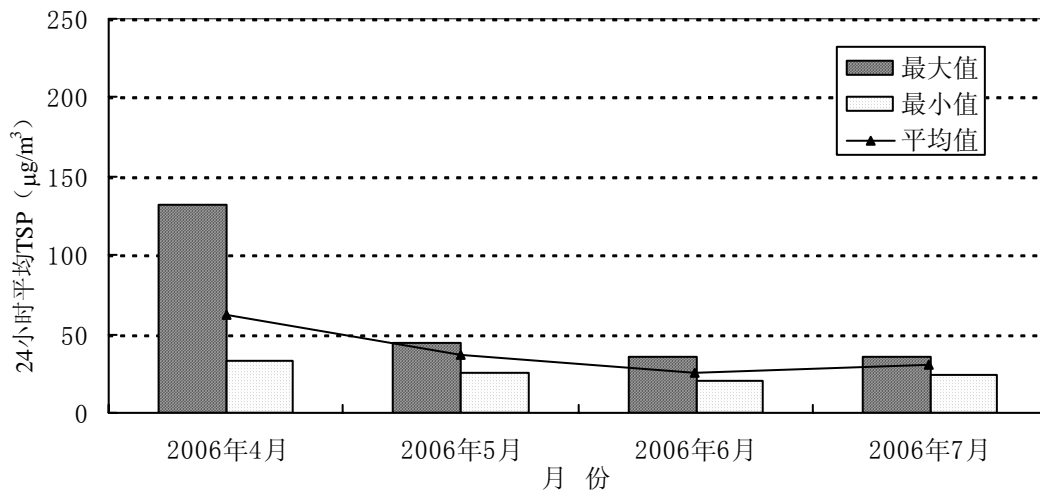
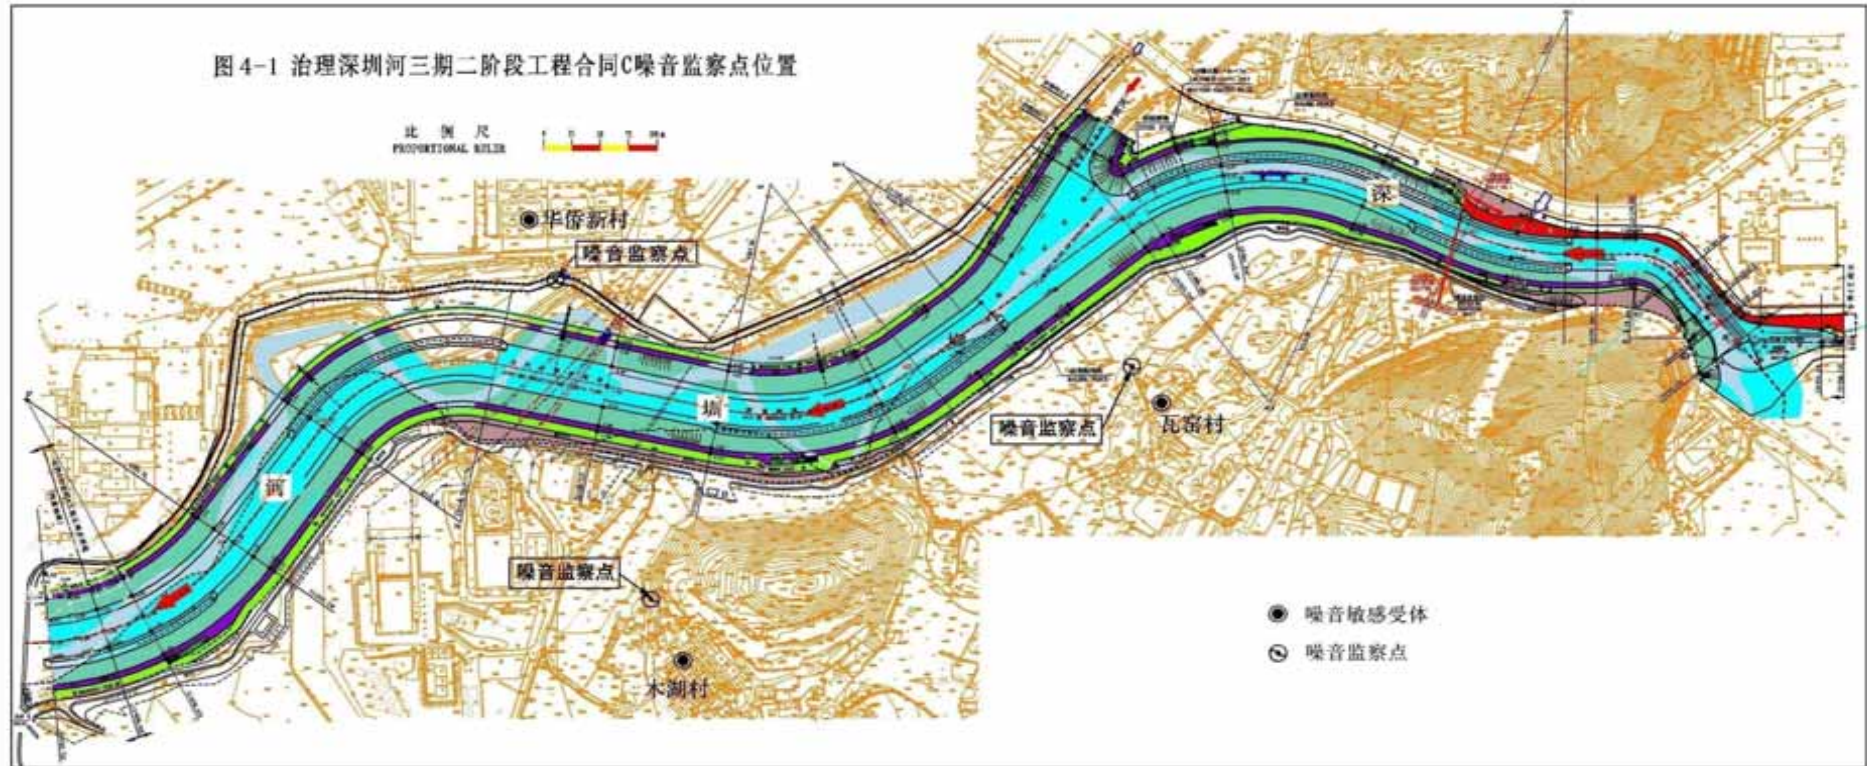


图3-6 2006年4月至7月香港瓦窑村监察点24小时TSP变化趋势

香港木湖村

香港木湖村监察点 2006 年 4 月至 7 月 24 小时平均 TSP 变化趋势见图 3-7。如图所示，本报告期均值和最大值水平虽然结束了过去连续三个报告期的递减变化，均较上一个报告期有较大幅度的上升，但在过去四个报告期香港木湖村的空气污染水平均处于很低的水平，总体而言，自 4 月进入雨季以来，阴雨天明显增多，对抑制地面起尘，降低空气中的粉尘含量起到一定作用，本报告期香港木湖村附近 IIC 工程施工段扬尘影响很轻，在过去四个报告期香港木湖村空气监察点环境空气质量状况均属良好。



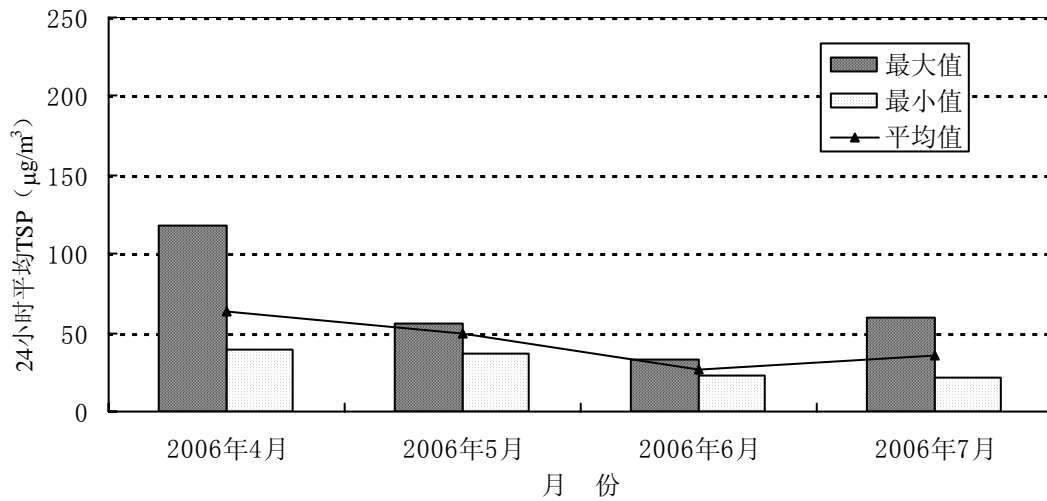


图3-7 2006年4月至7月香港木湖村监察点24小时TSP变化趋势

4 噪音

4.1 监察项目、点位及频率

监察项目：在深圳侧华侨新村噪音监察点和香港侧瓦窑村噪音监察点昼间（07:00~19:00，一般节假日除外），测定30分钟连续等效声级 L_{Aeq} 作为评价值，同时统计 L_{10} （在规定的时间内有10%的时间声级超过此声级）、 L_{90} （在规定的时间内有90%的时间声级超过此声级）作为补充资料分析。

监察点位：根据《治理深圳河第三期工程环境影响评估报告》和《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》要求，在可能受施工噪音影响的三个敏感点（深圳侧华侨新村、香港侧瓦窑村和木湖村）附近分别设置噪音监察点，其位置见图4-1。

监察频率：根据《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》要求，本报告期7月4日、5日、11日、12日、18日、19日、25日和26日，在深圳华侨新村监察点共进行8次昼间 $Leq(30min)$ 监察。本报告期环监小组于7月4日、5日、11日、12日、18日、19日、25日和26日分别在瓦窑村和木湖村监察点共进行8次昼间 $Leq(30min)$ 监察。

4.2 监察仪器与监察方法

4.2.1 仪器与校准

噪音监测采用日本产KANOMAX-4430型积分声级计进行，测定噪音前用内置式声级校准器进行校准，标准声级为94dB(A)。

4.2.2 监察方法

噪音指标 $Leq(30min)$ 的监察采用积分式声级计现场测量。噪音监察选择在没有雨、无雪、风力小于四级（5.5m/s）的气象条件下进行。噪音测量时声级计水平放置在距水平支承面1.2m、背向最近反射体。噪音测量前积分式声级计均先进行校准。噪音单位为dB(A)。

4.3 监察结果

本报告期在深圳侧华侨新村监察点进行了 8 次昼间噪音声级 Leq(30min)监察，在香港侧瓦窑村和木湖村监察点分别进行了 8 次昼间噪音声级 Leq(30min)监察，结果列表 4-1。

表 4-1 2006 年 7 月治理深圳河第三期合同 C 工程噪音监察结果

监察 点位	监察日期	监察时间	风 速	风 向*	天气状况	Leq(30min)	L ₁₀	L ₉₀
	(yy-mm-dd)	(hh:mm)	(m/s)	(度)		dB(A)	dB(A)	dB(A)
深圳 华侨 新村	06-07-04	09:20~09:50	0.7	136	阴	61.4	57.6	55.2
	06-07-05	10:17~10:47	3.7	20	多云	65.0	66.1	59.4
	06-07-11	09:36~10:06	0.7	91	阴有小阵雨	63.2	64.3	57.8
	06-07-12	09:40~10:10	1.1	226	晴	57.4	56.0	51.7
	06-07-18	09:31~10:01	1.4	114	晴	58.1	58.8	52.1
	06-07-19	09:40~10:10	0.9	253	晴	62.5	60.3	51.3
	06-07-25	09:45~10:15	0.8	250	晴	63.7	60.0	52.7
	06-07-26	09:18~09:48	0.8	226	多云	61.5	62.0	53.2
	平均值					61.6	60.6	54.2
	最大值					65.0	66.1	59.4
最小值					57.4	56.0	51.3	
香港 瓦窑 村	06-07-04	10:05~10:35	0.7	136	阴有小阵雨	58.4	64.2	49.9
	06-07-05	10:36~11:06	3.7	20	多云	53.4	54.6	51.8
	06-07-11	10:13~10:43	0.7	91	阴有小阵雨	58.2	59.4	54.5
	06-07-12	10:25~10:55	1.1	226	多云	54.5	59.6	52.3
	06-07-18	10:10~10:40	1.4	114	多云	55.8	56.7	52.1
	06-07-19	09:58~10:28	0.9	253	晴	57.5	59.4	54.6
	06-07-25	09:52~10:22	0.8	250	多云	56.6	60.0	50.6
	06-07-26	09:58~10:28	0.8	226	多云	55.3	57.2	53.4
	平均值					56.2	58.9	52.4
	最大值					58.4	64.2	54.6
最小值					53.4	54.6	49.9	
香港 木湖 村	06-07-04	10:48~11:18	0.7	136	阴有小阵雨	55.1	55.6	50.4
	06-07-05	11:19~11:49	3.7	20	多云	49.2	50.5	43.8
	06-07-11	10:58~11:28	0.7	91	阴有小阵雨	54.3	55.5	52.6
	06-07-12	11:13~11:43	1.1	226	多云	56.4	59.2	53.4
	06-07-18	10:53~11:23	1.4	114	多云	56.0	57.3	53.0
	06-07-19	10:43~11:13	0.9	253	晴	52.0	53.2	49.2
	06-07-25	10:35~11:05	0.8	250	多云	52.9	55.2	49.6
	06-07-26	10:38~11:08	0.8	226	多云	53.5	55.3	50.0
	平均值					53.7	55.2	50.3
	最大值					56.4	59.2	53.4
最小值					49.2	50.5	43.8	

*正北为 0 度，顺时针方向量度

4.4 审核

4.4.1 启动、行动和极限(TAL)水平及行动计划

根据《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》，治理深圳河第三期合同 C 工程噪音监察的启动、行动和极限三个水平见表 4-2。

表 4-2 III C 工程建造期间噪音的启动、行动和极限水平规范

启动水平	行动水平		极限水平	
			香港侧	深圳侧
在 19:00~07:00 间接到一起噪音扰民投诉	非节假日及周末 7:00~19:00	港方：一周内接到一起以上噪音扰民投诉 深方：一周内接到同一噪音源的 3 起投诉	同一测点连续 2 次超出 75dB(A)	一周内接到同一噪音源 4 起以上投诉
	19:00~23:00、节假日及周末 7:00~23:00		同一测点连续 2 次超出 70dB(A)	
	23:00~7:00		同一测点连续 2 次超出 55dB(A)	

《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》规定相应于 3 个噪音控制水平的行动计划见表 4-3。

表 4-3 III C 工程建造期间噪音监察行动计划

TAL	行动计划	
	环境监察审核小组或雇主	承建商
启动水平	1. 通告承建商 2. 调查分析超标原因 3. 要求承建商采取一定的纾缓措施	1. 实施纾缓措施
行动水平	1. 通告承建商 2. 调查分析超标原因 3. 要求承建商提出纾缓措施建议并实施 4. 增加监察频率以核查纾缓措施效果	1. 向雇主和环境监察审核小组提交降噪措施 2. 实施纾缓措施
极限水平	1. 通告承建商 2. 通知深港环保局（署） 3. 要求承建商实施纾缓措施，并增加监察频率以核查纾缓效果	1. 实施纾缓措施 2. 向雇主和环境监察审核小组提交实施纾缓措施后的效果材料

4.4.2 噪音污染状况

深圳华侨新村：

本报告期 7 月 4 日、5 日、11 日、12 日、18 日、19 日、25 日和 26 日昼间，在深圳华侨新村监察点分别进行了 8 次 Leq (30min) 监察，噪音声级 Leq (30min) 在 57.4~65.0dB(A) 之间。本报告期深圳华侨新村监察点附近的施工噪音源主要是河道疏浚船只、挖土机和运输车辆等施工噪音，由于施工场地开阔、机械使用分布较为分散，且两岸已建成的堤墙对噪音的屏障作用，加上受阴雨和台风天气的影响工区施工强度较小，本报告期深圳华侨新村噪音监察点受施工噪音影响不大，声环境状况较好。本报告期华侨新村监察点昼间噪音声级变化趋势见图 4-2。

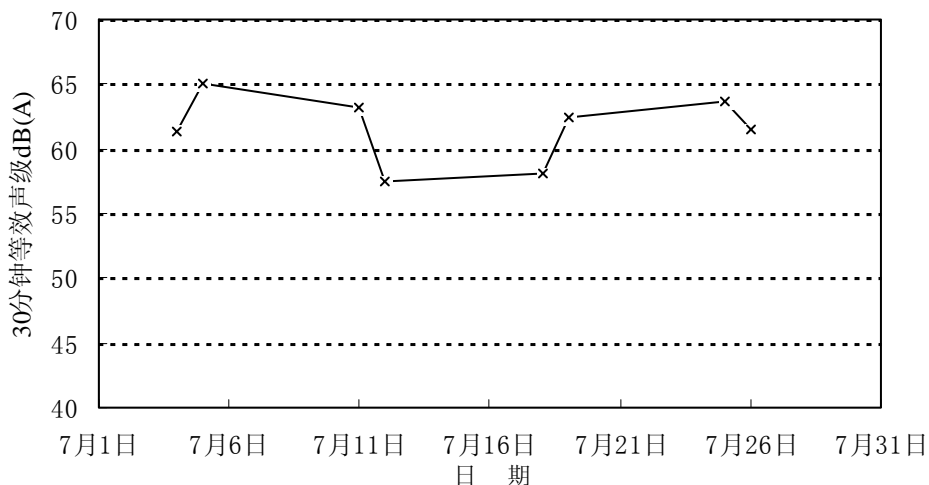


图4-2 2006年7月华侨新村监察点昼间噪音声级变化趋势

深圳华侨新村监察点基线昼间噪音声级 $Leq(30min)$ 的平均值为 54.5 dB(A)，范围在 54.0~55.6dB(A) 之间。本报告期深圳华侨新村监察点 8 次监测结果均超出基线范围最大值。本报告期深圳华侨新村监察点昼间噪音声级 $Leq(30min)$ 平均值为 61.6dB(A)，高于基线昼间噪音声级平均值 54.5dB(A)，但低于上一个报告期昼间噪音声级平均值 62.8dB(A)；本报告期深圳华侨新村监察点 L_{10} 范围在 56.0~66.1 dB(A) 之间，其平均值为 60.6dB(A)； L_{90} 范围在 51.3~59.4dB(A) 之间，其平均值为 54.2dB(A)。本报告期深圳华侨新村监察点 L_{Aeq} 平均值、 L_{10} 均值和 L_{90} 均值水平均较低，可见，本报告期深圳华侨新村监察点受工程施工噪音影响较小，声环境状态较好。本报告期华侨新村监察点昼间噪音污染水平高于基线监察时期，但要低于上一个报告期。

深圳侧噪音扰民投诉

本报告期环监小组于 7 月 27 日接到 1 起有关 III C 工程深圳侧施工噪音扰民投诉。环监小组根据《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》规定，采取了相应的行动水平计划。环监小组接到投诉后，立即赴现场进行调查核实，同时通知承建商采取纾缓措施，消除施工噪音扰民，并及时回访投诉人，落实措施效果。本报告期环监小组继续加强工区施工环境管理，多次到工地进行现场巡查施工噪音影响情况，及时发现和制止施工噪音扰民现象，督促施工人员文明、规范施工。

经调查，本报告期的这起噪音投诉主要是由于承建商在文锦渡施工区进行施工作业，影响了附近居民的正常生活。环监小组当即要求承建商采取明确有效的降噪措施，严格控制施工时段，采取措施减轻噪音污染。承建商积极回应，对投诉事件进行了及时的处理和回访，并制订较详细的噪音纾缓措施，严格控制施工作业时间，避免施工噪音扰民。

香港瓦窑村：

本报告期 7 月 4 日、5 日、11 日、12 日、18 日、19 日、25 日和 26 日昼间，在香港瓦窑村监察点进行 8 次 $Leq(30min)$ 噪音监察，噪音声级 $Leq(30min)$ 在 53.4~58.4dB(A) 之间。本报告期香港瓦窑村噪音敏感点香港侧工程施工强度小，区段内的河底防护边坡及护脚施工和水下疏浚开挖作业对该噪音敏感点产生一定影响，但由于施工场地开阔，并且已完建的河堤对施工噪音产生屏障作用，施工作业对环境噪音影响不大。本报告期香港瓦窑村监察点昼间噪音声级变化趋势见图 4-3。如图所示，本报告期香港瓦窑村监察点的 8 次监察结果的监测水平值均较低，最大值也仅为 58.4dB(A)，可见本报告期工程施工对香港瓦窑村噪音敏感点的噪音影响程度较轻，声环境状况良好。

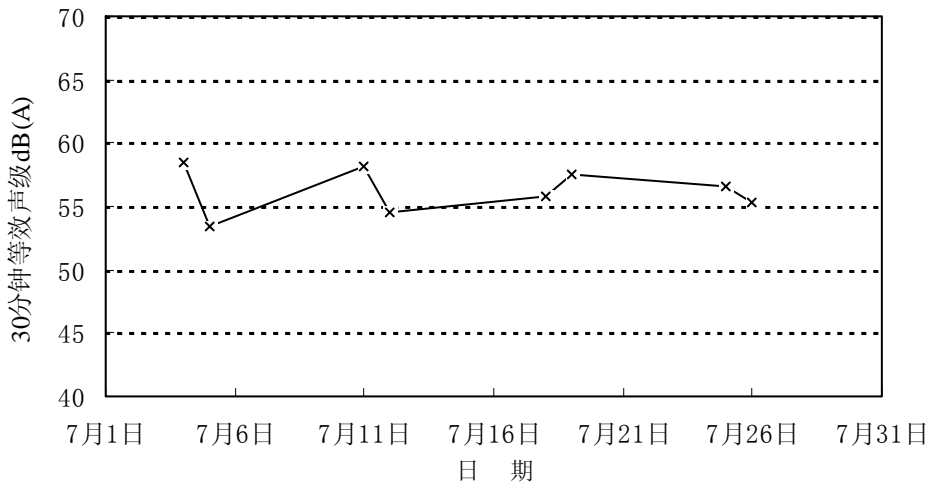


图4-3 2006年7月瓦窑村监察点昼间噪音声级变化趋势

香港瓦窑村监察点基线昼间噪音声级 $Leq(30min)$ 平均值为 51.4 dB(A)，范围在 45.5~56.7dB(A) 之间。本报告期香港瓦窑村监察点 8 次监测结果有 5 次在基线范围内，另 3 次超出了基线范围最大值。本报告期香港瓦窑村监察点昼间噪音声级 $Leq(30min)$ 监测结果平均值为 56.2dB(A)，高于基线昼间噪音声级平均值 51.4dB(A)，也高于上一个报告期平均值 53.7dB(A)；本报告期香港瓦窑村监察点 L_{10} 范围在 54.6~64.2dB(A) 之间，其平均值为 58.9 dB(A)； L_{90} 范围在 49.9~54.6dB(A) 之间，其平均值为 52.4dB(A)。本报告期香港瓦窑村监察点噪音 L_{Aeq} 平均值、 L_{10} 均值和 L_{90} 均值水平均较低，可见工程施工对香港瓦窑村噪音影响较小，声环境状况良好。本报告期香港瓦窑村监察点的噪音污染水平高于基线时期，也高于上一个报告期。

香港木湖村：

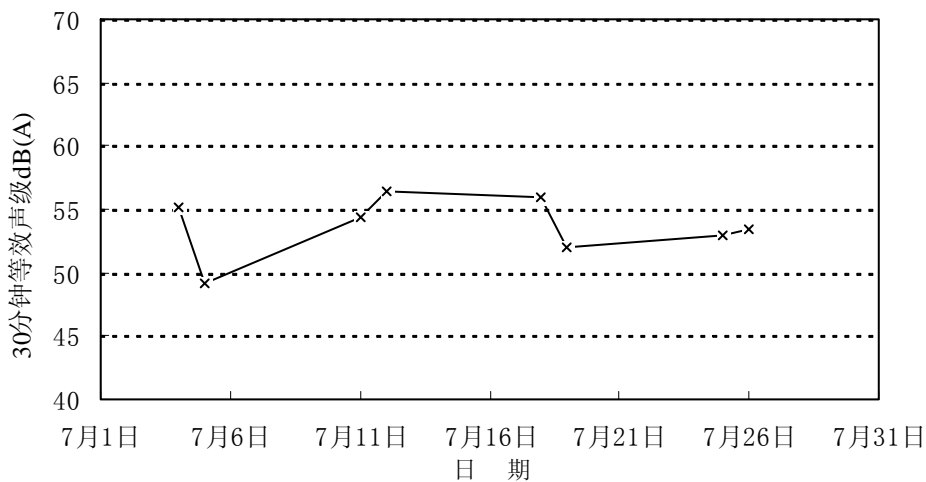


图4-4 2006年7月木湖村监察点昼间噪音声级变化趋势

本报告期 7 月 4 日、5 日、11 日、12 日、18 日、19 日、25 日和 26 日昼间，在香港木湖村监察点分别进行了 8 次 $Leq(30min)$ 监察，噪音声级 $Leq(30min)$ 在 49.2~56.4dB(A) 之间。本报告期香港木湖村监察点香港侧工程施工强度小，区段内的河底防护边坡及护脚施工和水上疏浚开挖对该噪音敏感点产生较小影响，加上施工场地开阔，已完建的河堤对施工噪音的屏障作用，施工噪音对工区环境影响不大。香港木湖

村监察点昼间噪音声级变化趋势见图 4-4。如图所示，本报告期香港木湖村监察点 8 次监测结果虽有较大的起伏变化，但各次监测水平值均处于较低水平，最大值也仅为 56.4dB(A)，可见本报告期香港木湖村噪音敏感点受工程施工噪音影响较轻，声环境状况良好。

香港木湖村监察点基线昼间噪音声级 $Leq(30min)$ 的平均值为 49.5 dB(A)，范围在 45.7~52.1dB(A)之间，本报告期 8 次监测结果 2 次在基线范围内，另 6 次均超出了基线范围最大值。本报告期香港木湖村监察点昼间噪音声级 $Leq(30min)$ 监测结果平均值为 53.7dB(A)，高于基线平均值 49.5dB(A)，略高于上一个报告期平均值 53.2dB(A)；本报告期香港木湖村监察点 L_{10} 范围在 50.5~59.2dB(A)之间，其平均值为 55.2dB(A)； L_{90} 范围在 43.8~53.4dB(A)之间，其平均值为 50.3dB(A)。本报告期香港木湖村监察点噪音 L_{Aeq} 平均值、 L_{10} 均值和 L_{90} 均值水平均很低，可见工程施工对香港木湖村监察点的环境噪音影响较小，声环境状况良好。本报告期香港木湖村监察点噪音污染水平高于基线时期，也略高于上一个报告期。

本报告期香港瓦窑村和木湖村监察点各次昼间 $Leq(30min)$ 噪音声级水平均未超过《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》规定的香港侧噪音监察水平规限，也未收到香港侧有关 IIIC 工程噪音扰民的投诉，因此没有采取与启动、行动、极限 (TAL) 水平相应的行动。

4.4.3 噪音污染趋势分析

深圳华侨新村

2006 年 4 月至 7 月深圳侧华侨新村昼间监察点噪音声级变化趋势见图 4-5。如图所示，过去四个报告期深圳华侨新村监察点噪音污染程度均较轻。本报告期均值和最大值水平结束了过去连续三个报告期的递增变化趋势，较上一个报告期均有所降低。总体而言，在过去四个报告期，深圳华侨新村监察点受工程施工噪音影响不大，噪音污染整体水平均处于较低的水平，声环境状况良好。

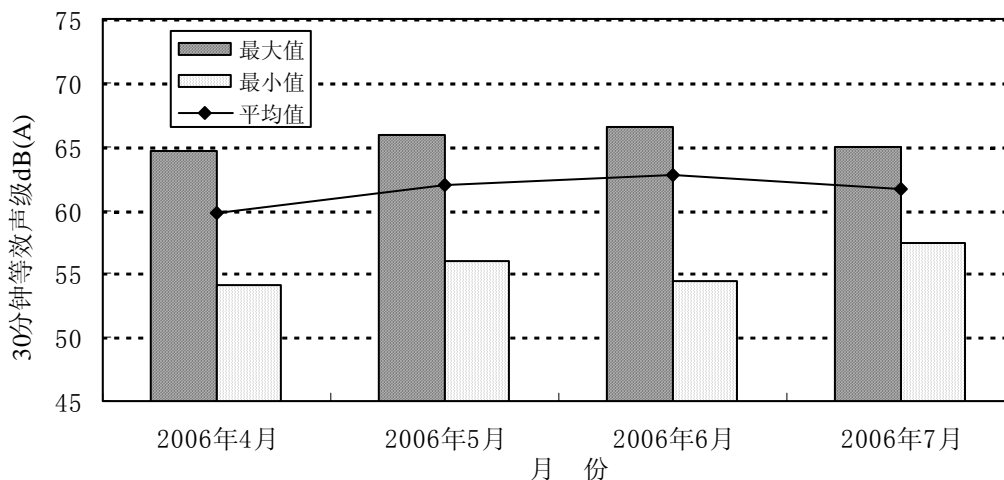


图4-5 2006年4月~7月华侨新村监察点昼间噪音变化趋势

香港瓦窑村

2006 年 4 月至 7 月香港瓦窑村监察点昼间噪音声级变化趋势见图 4-6。由图可见，过去四个报告期香港瓦窑村监察点噪音污染水平整体有起伏交替的变化，且均处于较低的水平，虽然本报告期的各项统计指标水平均较前三个报告期分别有不同程度的上升，但本报告期的均值 (56.2dB(A))、最大值 (58.4dB(A)) 和最小值 (53.4dB(A)) 各值均属较低。可见在过去四个报告期香港瓦窑村监察点受工程施工噪音影响较轻，声环境状况良好。

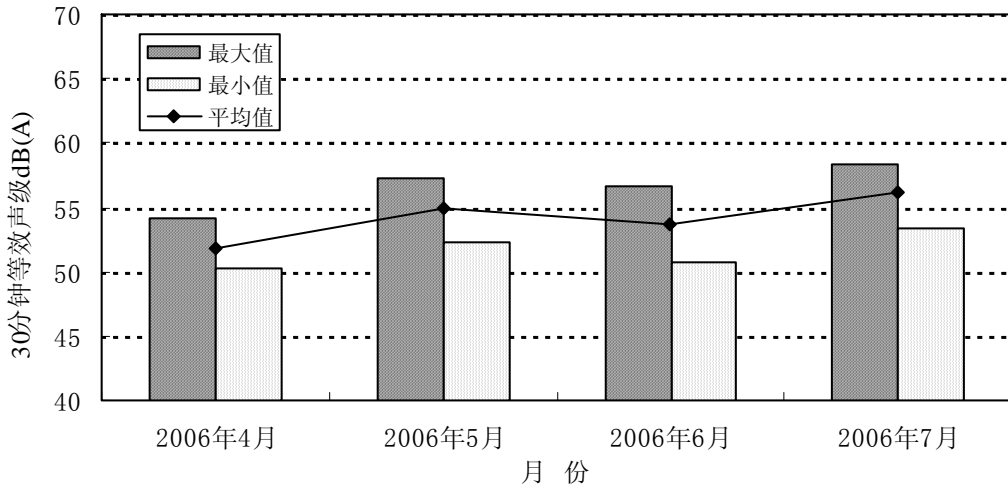


图4-6 2006年4月~7月瓦窑村监察点昼间噪音变化趋势

香港木湖村

2006年4月至7月香港木湖村监察点昼间噪音声级变化趋势见图4-7。如图所示，过去四个报告期香港木湖村监察点噪音污染水平整体虽有起伏交替的变化，但四个报告期最大值指标的最大水平为2006年4月份报告期的57.3dB(A)，平均值指标的最大水平为2006年5月份报告期的55.0dB(A)，各值均属较低。可见在过去四个报告期，III C工程施工噪音对香港木湖村敏感点影响很小，施工噪音污染程度较轻，声环境状况良好。

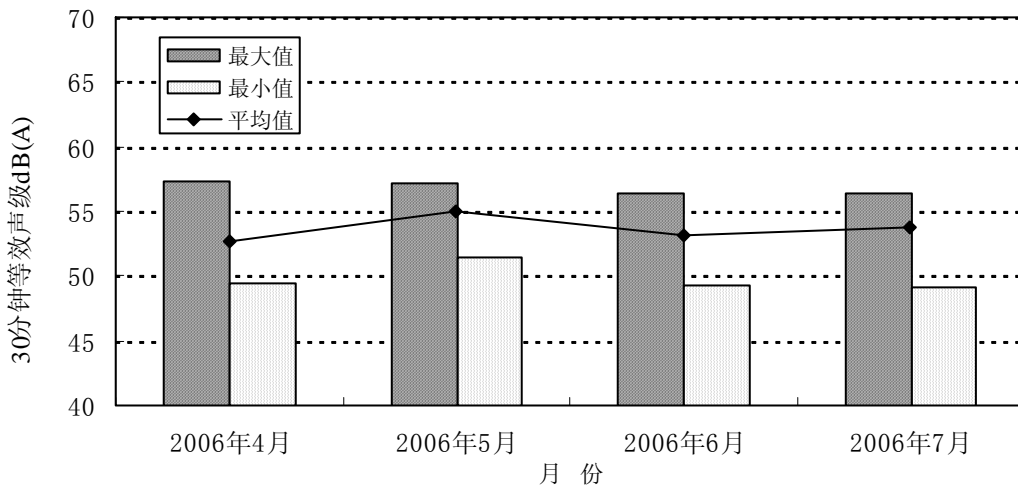


图4-7 2006年4月~7月木湖村监察点昼间噪音变化趋势

5 水质

本报告期环监小组继续在深圳河III C工程段上游平原河入口段设1个水质监察点(Mcc)，作为III C工程施工对深圳河水质影响的对照断面，在合同B、C连接处设1个水质监察点(Mbc)作为控制断面，在


三期工程下游 1,500m 处的鹿丹村河段设固定监察点、在深圳河河口段设永久监察点，实施水质监察。

本报告期环监小组继续在 III C 工程水下疏浚地点上、下游分别设置对照点和控制点，进行每周 2 次的水下疏浚水质监察。

根据批准的《非污染土海上弃置转运水质监测方案》，本报告期环监小组继续对 III C 工程深圳湾非污染土海上弃置转运进行水质监察与审核。

5.1 监察点位、项目和频率

深圳河监察点位：在合同 C 工程区上游 500m 处的平原河口水质监察点 (Mcc)、位于三期工程合同 B、C 连接处水质监察点 (Mbc)、治理深圳河第三期工程下游 1,500 处鹿丹村固定水质监察点 (MI)、深圳河河口永久水质监察点 (MII)，共 4 个水质监察点，进行每月一天的水质监察。深圳河水质监察点位布置见图 5-1。

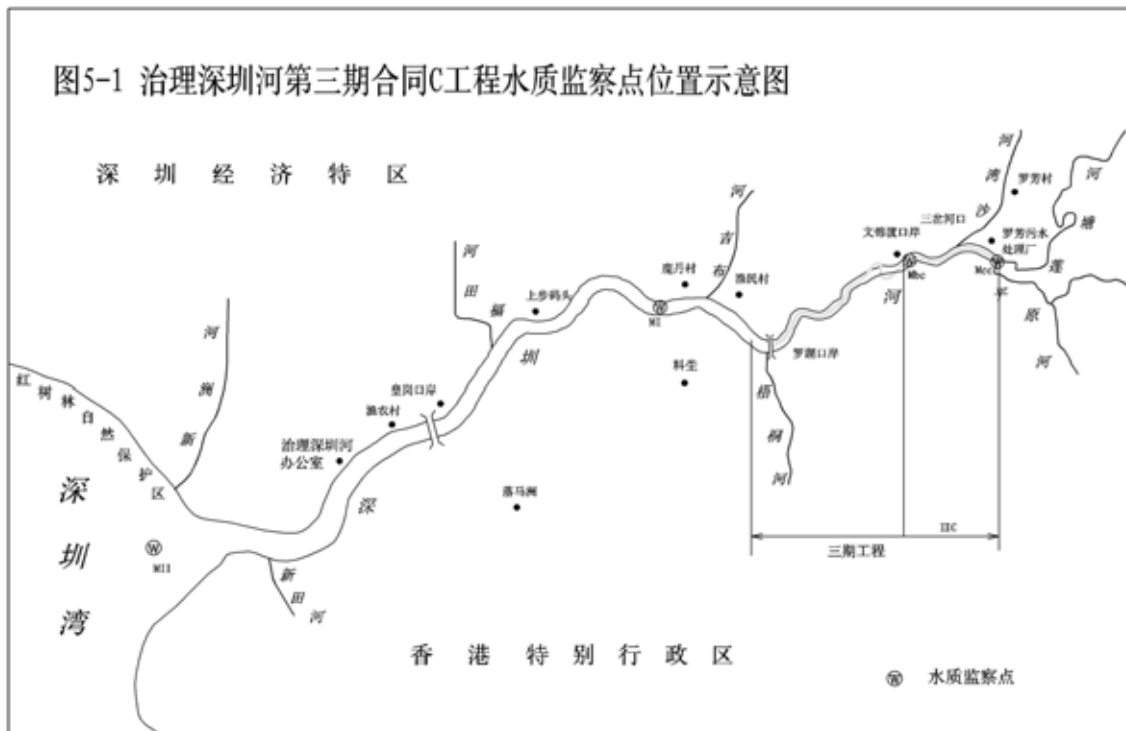

本报告期承建商在桩号 12+500~12+750 段进行疏浚，环监小组继续进行水下疏浚水质监察。环监小组按照《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》的规定，在开挖点上游 500m 处设立对照断面 (Mup)，在开挖点下游 1,000m 处设立控制断面 (Mdn) 进行水下疏浚水质监察。水下疏浚水质监察点布置见图 5-2。




图 5-2 III C 工程水下疏浚水质监察点布置示意图

非污染土海上弃土转运场监察点位:在转运场出入口处及自转运场至主航道方向 2000m 处各设 1 个水质监察点, 另在转运场防泥帘幕外主航道方向 500m 处, 根据潮流方向在其上游 500m 处设立对照点、在其下游 1000m 设立控制点, 共 6 个水质监察点。非污染土海上弃置转运场位置见图 5-3。非污染土海上弃置转运场各水质监察点布置见图 5-4。



图 5-3 非污染土海上弃置转运场位置示意图

各水质监察点位坐标见表 5-1。

表 5-1 治理深圳河第三期合同 C 工程水质监察点位

监测地点	监察点	监察点坐标	
		东 经	北 纬
深圳河	文锦渡	114°07'36.4"	22°32'21.5"
	罗湖上	114°06'57.4"	22°31'56.7"
	鹿丹村	114°05'53.5"	22°32'03.2"
	深圳河口	114°00'54.4"	22°30'01.7"
海上转运场	转运场出入口	113°57'20.3"	22°30'07.4"
	主航道	113°57'43.0"	22°29'06.3"
	涨潮期对照点	113°57'10.0"	22°29'44.5"
	涨潮期控制点	113°57'54.8"	22°30'10.3"
	落潮期对照点	113°57'42.0"	22°29'56.7"
	落潮期控制点	113°57'02.5"	22°29'26.1"

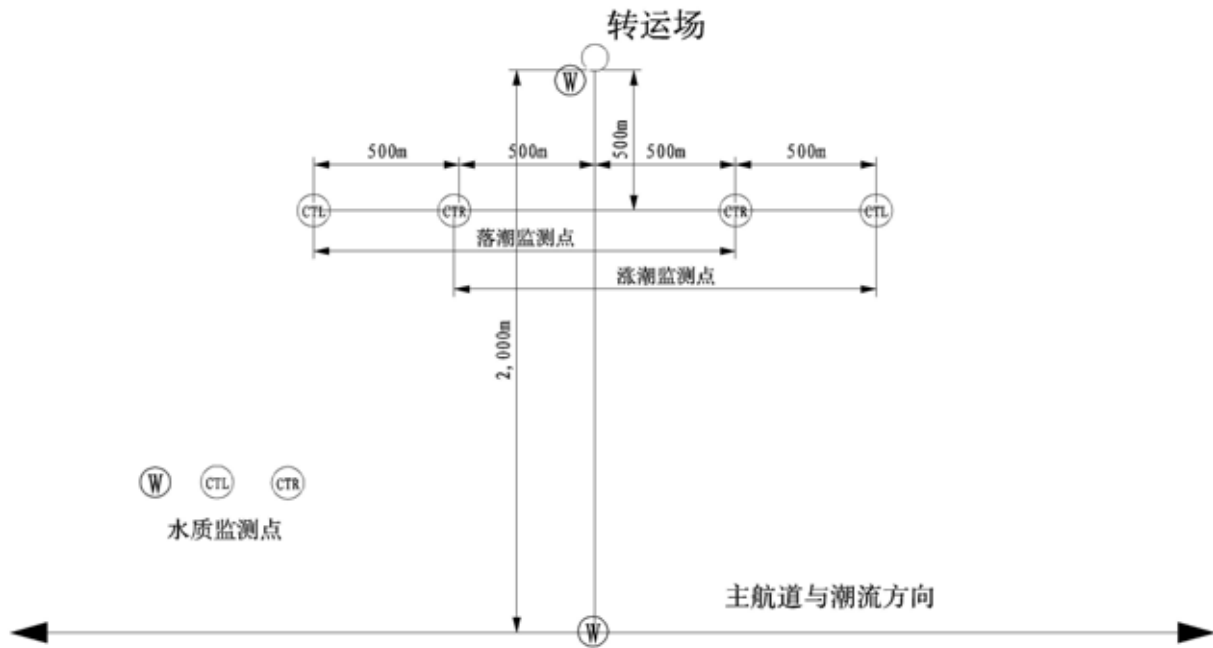


图5-4 三期工程弃土转运作业水质监测点位置示意图

5.1.1 监察项目

深圳河：根据《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》的要求，在 MI、MII、Mab 和 Mbc 这 4 个水质监察点每月一天的监察项目为 pH、DO、流速、电导率、盐度、悬浮物（SS）、BOD₅、氨氮、总氮、总磷及总铜共 11 项，同时记录采样点位置、采样时间、水深、水温、流速和涨、落潮情况等水文要素以及风速、风向、气温、日照等气象要素。水下疏浚水质监察项目为 pH、DO、电导率、盐度和悬浮物（SS）。

非污染土海上弃置转运场监察项目：根据《非污染土海上弃置转运水质监测方案》，在非污染土海上弃置转运场各水质监察点进行的每月 1 天长周期水质监察的项目包括 pH、DO、流速、电导率、盐度、悬浮物（SS）、BOD₅、氨氮、总氮、总磷及总铜共 11 项，同时记录采样点位置、采样时间、水深、水温、涨落潮情况等水文要素以及风速、风向、气温、日照等气象要素；每周短周期水质监察项目为 pH、DO、电导率、盐度及悬浮物（SS）。

5.1.2 监察频率

深圳河监察频率：

平原河水质监察点（Mcc）、三期工程合同 B、C 连接处水质监察点（Mbc）、鹿丹村固定监察点（MI）和深圳河河口永久监察点（MII）每月进行 1 天的长周期水质监察，于涨、落潮期间分别采样监察一次。水下疏浚水质监察为每周 2 次，均在落潮期进行。另在上述 4 个固定水质监察点进行每月 1 天的水质监察同时，在这两个水下疏浚水质监察点进行 1 天相同的水质项目采样监察。

非污染土海上弃置转运场监察频率：

在深圳湾非污染土海上弃置转运场 6 个水质监察点，进行每月 1 天的长周期水质监察及每周 1 天的短周期水质监察。

5.2 分析方法与监察仪器

5.2.1 仪器校准和测量方法

使用 YSI-6920 型多参数水质监测仪测定水温、pH、DO、电导率和盐度 5 项参数。仪器出厂前，厂商对测定不同参数的探头均进行了校准，使之符合 EN61000-4-6 标准。每次使用前对测定不同参数的探头均用相应标准溶液校准一次，pH 采用三点校准（即用 pH 分别为 4、7 和 10 的缓冲溶液校准），溶解氧采用测量当天的大气压强进行校准，电导率用一点校准（由厂商提供的电导值为 1000 μ S/cm 标准溶液校准），流速仪每两月校准一次，分析天平、生化培养箱、紫外及可见分光光度计、原子吸收分光光度计每年校准一次，由深圳计量测试所进行，取得计量测试合格证书后使用。

本报告期水质监察所采用的分析方法与监察仪器参见表 5-2。

表 5-2 水质分析方法与监察仪器

监察项目	分析方法	主要仪器名称及型号	计量单位
水温	热敏电阻法	YSI-6920 型多参数水质监测仪	℃
pH	玻璃电极法	YSI-6920 型多参数水质监测仪	—
流速	流速仪	Swoffer2100 型流速计	m/s
DO	电化学法	YSI-6920 型多参数水质监测仪	mg/L
电导率	电导仪法	YSI-6920 型多参数水质监测仪	μ S/cm
悬浮物	重量法	德国 BP211D 型电子天平	mg/L
盐度	电导仪法	YSI-6920 型多参数水质监测仪	g/L
BOD ₅	稀释与接种法	YSI-59 型溶氧仪及生化培养箱	mg/L
氨氮	靛酚蓝分光光度法	Quikchem8000 型流动注射仪	mg/L
TN	紫外分光光度法	HP8452A 型紫外分光光度计	mg/L
TP	钼酸铵分光光度法	日本岛津 UV-1206 型紫外/可见分光光度计	mg/L
Cu	原子吸收分光光度法	国产 WFX-120 原子吸收分光光度计	μ g/L

在现场采样前首先测量采样点水深，于水深一半处采集水样，同时对水温、pH 值、溶解氧、流速、电导率和盐度进行现场监测，并对水的气味(嗅)、感官指标和水面漂浮物作现场记录。测定中，将探头静置于水中，待仪器读数显示稳定后读取数据，作好记录（分别作文字记录和仪器内部储存）。SS、BOD₅、氨氮、TN、TP 和 Cu 水样于 6 小时内送达实验室，于冰箱中冷藏保存。SS 和 BOD₅ 的分析均在在 24 小时内进行；其它水质参数亦在规定的时间内完成。采样容器材料为聚乙烯塑料，容器先用洗涤剂清洗，自来水冲净，在 10% 硝酸或盐酸中浸泡 8 小时后再用自来水冲净，最后用纯净水清洗干净，并贴好标签备用。

5.2.2 实验室质量控制

为保证环境监测数据正确可靠，环监小组采用如下措施进行水质分析实验质量控制：

- 1) 空白试验值控制：每批样品，一次平行测定至少二个空白试验值。平行测定的相对偏差不得 >50%；
- 2) 平行双样控制：根据分析方法和测定仪器的精密度、样品的具体情况以及分析人员的水平和经验等，随机抽取 10%~20% 的样品进行平行双样测定，合格率应达到 $\geq 95\%$ ；
- 3) 加标回收控制：根据分析方法、测定仪器、样品情况和操作水平等，随机抽取 10%~20% 的样品进行加标回收的测定，回收率按 95%~105% 之间控制，合格率应达到 $\geq 95\%$ ；
- 4) 密码标样控制：使用标准物质与样品同步进行测定，结果应在给定值的“不确定度”范围内。

5.3 监察结果

5.3.1 深圳河

水下疏浚水质监察

本报告期承建商在桩号 12+500~12+750 段进行水下疏浚。环监小组按照《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》规定，本报告期共安排 8 次水下疏浚水质监察，在深圳河文锦渡以上河段受深圳湾涨潮影响不大，III C 工程河道疏浚水质监测仅在落潮期进行，监察结果见表 5-3。

表 5-3 2006 年 7 月治理深圳河第三期合同 C 工程深圳河水下疏浚水质监察结果

日期 (yy-mm-dd)	监察 结果	时间	潮汐	水深	流速	水温	pH	DO	DOS	电导率	盐度	SS
				m	m/s	°C		mg/L	%	µs/cm	g/L	mg/L
06-07-05	Mup	10:08	落	1.35	0.36	29.6	6.23	7.35	96.6	446	0.21	36.4
	Mdn	10:33	落	4.27	0.09	30.6	6.39	7.13	95.4	458	0.22	49.0
06-07-07	Mup	09:50	落	1.20	0.39	29.7	6.18	4.70	63.4	519	0.25	44.7
	Mdn	10:12	落	4.60	0.10	30.6	6.42	4.45	61.3	522	0.25	31.4
06-07-11	Mup	10:05	落	1.25	0.28	28.6	6.45	1.01	13.1	411	0.19	24.0
	Mdn	10:26	落	4.80	0.11	28.6	5.99	1.00	12.9	338	0.16	53.1
06-07-14	Mup	16:05	落	3.60	0.15	30.7	6.52	2.61	35.6	530	0.24	26.9
	Mdn	16:22	落	1.60	0.31	30.5	6.56	4.01	54.8	503	0.24	13.6
06-07-19	Mup	09:34	落	2.00	0.30	28.3	5.30	4.64	59.6	378	0.18	90.8
	Mdn	10:10	落	2.70	0.10	29.4	5.28	2.51	32.9	426	0.20	47.5
06-07-21	Mup	10:18	落	2.30	0.32	28.9	6.25	7.33	95.2	418	0.20	44.0
	Mdn	10:38	落	4.20	0.21	30.7	6.35	6.95	93.3	477	0.23	25.4
06-07-25	Mup	09:32	落	2.20	0.26	29.3	6.58	7.25	94.8	478	0.23	17.6
	Mdn	09:52	落	3.85	0.18	30.4	6.07	7.03	93.6	484	0.23	34.0
06-07-26	Mup	14:31	落	3.25	0.26	29.3	6.35	7.25	94.8	470	0.22	57.5
	Mdn	14:50	落	2.70	0.11	29.7	6.50	7.15	94.3	520	0.25	51.3

每月一天水质监察

2006 年 07 月 14 日在平原河口水质监察点 (Mcc)、三期工程合同 B、C 连接处水质监察点 (Mbc)、深圳河鹿丹村 (MI) 和深圳河口 (MII) 共 4 个水质监察点以及 III C 两个疏浚水质监察点进行每月 1 天的长周期水质监察，分别于涨潮期和落潮各采样监察 1 次，结果见表 5-4。

表 5-4 2006 年 7 月 14 日治理深圳河第三期合同 C 工程深圳河水质监察结果

监察 点位	时间 hh:mm	潮 汐	水深	流速	水温	pH	DO	DOS	电导率	盐度	SS	mg/L			总铜 µg/L	
			m	m/s	°C		mg/L	%	µs/cm	g/L	BOD ₅	氨氮	总氮	总磷		
平原 河口	11:09	涨	1.70	0.28	30.0	6.34	2.91	31.9	529	0.26	5.72	10.5	3.99	7.33	0.37	4.2
	16:20	落	1.65	0.28	30.5	6.45	4.38	59.8	503	0.24	33.3	19.3	4.89	10.2	0.59	5.8
	平均值			1.68		30.2	6.40	3.65	45.9	516	0.25	19.5	14.9	4.4	8.8	0.48
文 锦 渡	10:43	涨	3.75	-0.11	30.5	6.63	2.27	30.9	520	0.25	15.6	10.8	8.40	20.5	0.60	2.5
	15:58	落	4.25	0.13	30.7	6.48	2.63	35.9	527	0.25	14.4	15.0	6.52	9.74	0.75	2.3
	平均值			3.75		28.1	6.47	1.57	20.0	455	0.22	36.9	6.71	11.0	11.8	0.58
鹿 丹 村	10:25	涨	3.05	-0.21	30.2	7.00	1.86	24.8	611	0.29	49.2	30.6	12.89	18.4	1.70	25.5
	15:38	落	2.75	0.16	30.6	6.57	1.62	21.7	585	0.28	33.2	35.3	13.53	19.1	1.67	19.3
	平均值			2.90		30.4	6.79	1.74	23.3	598	0.29	41.2	33.0	13.2	18.7	1.68

表 5-4 2006 年 7 月 14 日治理深圳河第三期合同 C 工程深圳河水质监察结果

监察 点位	时间 hh:mm	潮 汐	水深 m	流速 m/s	水温 ℃	pH	DO	DOS	电导率 μs/cm	盐度 g/L	SS	BOD ₅	mg/L			总铜 μg/L
							mg/L	%					氨氮	总氮	总磷	
深圳 河口	10:00	涨	4.20	-0.30	30.9	6.99	4.47	61.0	5593	2.99	92.7	8.90	6.69	7.17	0.82	26.4
	15:09	落	4.30	0.31	31.8	6.72	4.05	55.3	6192	3.33	79.8	10.5	5.11	6.16	0.76	11.8
	平均值			4.25		31.3	6.86	4.26	58.2	5893	3.16	86.3	9.70	5.90	6.67	0.79
疏浚 点上	11:05	涨	1.80	0.30	30.0	6.20	2.88	31.6	458	0.22	11.5	10.6	4.04	7.38	0.39	3.7
	16:05	落	3.60	0.15	30.7	6.52	2.61	35.6	530	0.24	26.9	19.3	4.98	10.3	0.59	5.2
	平均值			2.70		30.3	6.36	2.75	33.6	494	0.23	19.2	15.0	4.51	8.84	0.49
疏浚 点下	10:47	涨	3.50	-0.10	30.4	6.62	2.20	30.0	521	0.25	14.0	10.8	7.24	9.40	0.59	2.4
	16:22	落	1.60	0.31	30.5	6.56	4.01	54.8	503	0.24	13.6	15.6	6.47	9.61	0.76	1.9
	平均值			2.55		30.4	6.59	3.11	42.4	512	0.25	13.8	13.2	6.86	9.50	0.67

5.3.2 非污染土海上弃置转运场

本报告期III C 工程继续在深圳湾非污染土海上弃置转运场进行弃置转运作业，环监小组按《非污染土海上弃置转运水质监测方案》要求，继续对非污染土海上弃置转运场进行每月 1 天的长周期水质监察和每周 1 天的短周期水质监察，本报告期非污染土海上弃置转运场水质监察共 4 天。

每月 1 天水质监察结果

根据《非污染土海上弃置转运水质监测方案》，本报告期环监小组于 2006 年 07 月 13 日对位于深圳湾的非污染土海上弃置弃土转运场进行了每月 1 天的长周期水质监察，结果见表 5-5。

表 5-5 2006 年 07 月 13 日非污染土海上弃置转运场水质监察结果

监察 点位	时间 hh:mm	潮 汐	水深 m	流速 m/s	水温 ℃	pH	DO	DOS	电导率 μs/cm	盐度 g/L	SS	BOD ₅	mg/L			总铜 μg/L
							mg/L	%					氨氮	总氮	总磷	
转运场 出入口 (WE)	10:15	涨	5.15	0.25	30.0	6.99	4.30	66.9	16998	9.93	18.5	2.21	1.90	2.74	0.16	15.1
	15:29	落	3.95	0.24	31.7	7.31	4.04	57.5	13610	7.75	40.8	5.41	2.75	3.12	0.26	4.5
	平均值			4.55		30.8	7.15	4.17	62.2	15304	8.84	29.7	3.81	2.33	2.93	0.21
主航道 (WC)	10:26	涨	4.55	0.31	30.0	7.20	5.51	85.8	16634	9.69	26.2	2.23	1.13	2.45	0.13	4.2
	15:41	落	4.10	0.27	32.3	7.69	6.33	89.9	10560	5.91	43.1	7.97	3.22	4.76	0.32	5.1
	平均值			4.33		31.2	7.45	5.92	87.9	13597	7.80	34.7	5.10	2.18	3.61	0.22
对照点 (CTR)	10:21	涨	4.30	0.30	30.6	7.45	6.13	96.4	15661	9.07	25.3	6.02	2.45	4.34	0.24	5.7
	15:23	落	3.70	0.21	31.8	7.45	4.18	59.1	11586	6.53	41.0	6.55	2.03	2.53	0.16	4.5
	平均值			4.00		31.2	7.45	5.16	77.8	13624	7.80	33.2	6.29	2.24	3.44	0.20
控制点 (CTL)	10:10	涨	4.70	0.28	30.0	7.00	4.77	74.1	16547	9.64	22.7	3.78	2.41	4.76	0.31	4.9
	15:36	落	5.00	0.20	31.3	7.61	5.77	81.9	15140	8.73	42.1	2.34	3.35	3.71	0.22	6.1
	平均值			4.85		30.6	7.31	5.27	78.0	15844	9.19	32.4	3.06	2.88	4.24	0.27

每周短周期水质监察结果

本报告期环监小组按《非污染土海上弃置转运水质监测方案》要求，本报告期对非污染土海上弃置转运场进行了 4 天的短周期水质监察，结果见表 5-6。

表 5-6 2006 年 07 月非污染土海上弃置转运场水质监察结果

监察 点位	日期	时间	潮汐	水深	流速	水温	pH	DO	DOS	电导率	盐度	SS	
	(yy-mm-dd)			M	m/s	°C		mg/L	%	μs/cm	g/L	mg/L	
转运场 出入口 (WE)	06-07-06	15:42	涨	2.85	0.23	31.6	7.87	5.26	82.7	12279	6.98	36.4	
		10:41	落	3.00	0.19	31.2	8.26	4.93	68.9	12286	6.98	32.4	
	06-07-13	10:15	涨	5.15	0.25	30.0	6.99	4.30	66.9	16998	9.93	18.5	
		15:29	落	3.95	0.24	31.7	7.31	4.04	57.5	13610	7.75	40.8	
	06-07-20	17:44	涨	3.85	0.21	31.4	7.74	6.69	92.6	7062	3.84	35.9	
		09:50	落	2.80	0.29	31.1	7.01	6.78	92.8	5348	2.85	29.5	
	06-07-28	11:08	涨	3.85	0.28	28.2	7.12	6.86	90.8	7858	4.38	21.3	
		15:21	落	4.75	0.35	28.5	7.04	7.25	96.0	8966	4.98	18.2	
	主 航 道 (WC)	06-07-06	15:30	涨	3.15	0.26	31.5	7.95	5.16	81.1	12396	7.05	37.2
			10:51	落	3.25	0.21	30.8	7.93	5.09	80.0	12438	7.07	34.6
		06-07-13	10:26	涨	4.55	0.31	30.0	7.20	5.51	85.8	16634	9.69	26.2
			15:41	落	4.10	0.27	32.3	7.69	6.33	89.9	10560	5.91	43.1
06-07-20		17:55	涨	4.70	0.20	31.1	7.93	6.75	92.9	7140	3.89	34.7	
		10:02	落	3.80	0.30	30.0	6.97	6.96	94.0	7458	4.08	14.0	
06-07-28		10:52	涨	4.10	0.23	27.7	6.94	6.44	85.3	7638	4.26	20.1	
		15:33	落	4.55	0.30	28.4	7.02	7.22	95.6	7696	4.23	16.5	
对 照 点 (CTR)		06-07-06	15:37	涨	2.75	0.22	31.4	7.98	5.24	82.4	12294	6.99	48.9
			10:36	落	2.98	0.26	31.1	7.88	6.79	95.0	12176	6.90	43.2
	06-07-13	10:21	涨	4.30	0.30	30.6	7.45	6.13	96.4	15661	9.07	25.3	
		15:23	落	3.70	0.21	31.8	7.45	4.18	59.1	11586	6.53	41.0	
	06-07-20	17:39	涨	4.20	0.25	31.5	7.80	6.67	92.4	6966	3.79	41.1	
		09:46	落	3.25	0.27	30.3	6.52	6.92	93.7	5663	3.04	27.8	
	06-07-28	10:58	涨	3.76	0.23	27.8	6.94	7.05	93.4	9385	5.23	19.7	
		15:26	落	4.20	0.26	28.7	7.07	7.28	96.4	9403	5.24	17.9	
控 制 点 (CTL)	06-07-06	15:51	涨	2.86	0.23	31.2	7.83	5.27	82.8	12728	7.23	42.3	
		10:46	落	3.20	0.21	30.9	7.95	5.15	81.5	12834	7.31	47.8	
	06-07-13	10:10	涨	4.70	0.28	30.0	7.00	4.77	74.1	16547	9.64	22.7	
		15:36	落	5.00	0.20	31.3	7.61	5.77	81.9	15140	8.73	42.1	
	06-07-20	17:48	涨	3.70	0.19	31.1	7.73	6.74	92.9	7094	3.86	42.4	
		09:57	落	4.95	0.21	30.0	6.82	7.00	94.1	5713	3.06	24.5	
	06-07-28	11:21	涨	4.35	0.26	27.5	6.58	7.03	93.1	9468	5.28	20.9	
		15:13	落	5.10	0.31	28.7	6.79	7.18	95.7	9520	5.31	14.2	

5.4 审核

5.4.1 启动、行动和极限(TAL)水平及行动计划

根据《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》，治理深圳河第三期合同 C 工程深圳河水质监察 (SS) 的启动、行动和极限三个水平见表 5-7。

表 5-7 III C 工程建造期深圳河水质监察启动、行动和极限水平规限

水 平	规 限
启动水平	控制点 SS 含量同时： (1) 高于 243mg/L (2) 一个监测日内高于对照点含量的 30% (即高于 SS+SS×30%)
行动水平	两个连续监测日中控制点值均超过启动水平
极限水平	三个连续监测日控制点值均超过启动水平

根据《非污染土海上弃置转运水质监测方案》，治理深圳河第三期合同 C 工程非污染土海上弃置弃土转运场水质监察（SS）的启动、行动和极限三个水平见表 5-8。

表 5-8 III C 工程建造期深圳湾海上弃置转运场水质监察启动、行动和极限水平规范

水 平	规 限
启动水平	控制点 SS 含量一个监测日内高于对照点含量的 30%（即高于 SS+SS×30%）
行动水平	两个连续监测日中控制点值均超过启动水平
极限水平	三个连续监测日控制点值均超过启动水平

根据《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》，治理深圳河第三期合同 C 工程深圳河水质监察（SS）的行动计划见表 5-9。根据《非污染土海上弃置转运水质监测方案》，治理深圳河第三期合同 C 工程非污染土海上弃置转运场水质监察（SS）行动计划同表 5-9。

表 5-9 III C 工程建造期深圳河及深圳湾海上弃置转运场水质监察行动计划

事 件	行 动 计 划		
	环境监察审核小组	工程主任	承 建 商
启 动 水 平	<ol style="list-style-type: none"> 1. 复查监测数据 2. 识别影响源 3. 如确因施工引起，通知雇主 4. 检查实验室和仪器设备以及承建商工作方法 5. 与工程主任及承建商讨论纾缓措施 6. 超标停止后，通知工程主任 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与环监小组和承建商讨论纾缓措施 2. 批准纾缓措施的实施 3. 评估纾缓措施实施效果 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查施工方法和施工设备 2. 更正不当作业方式 3. 接工程主任通告 3 天内提交纾缓措施 4. 实施经批准的纾缓措施
行 动 水 平	同启动水平，另增加： <ol style="list-style-type: none"> 1. 超标的第二天继续监测 2. 如持续超标，与工程主任、香港环保署及深圳环保局商讨纾缓措施 3. 向雇主、香港环保署及深圳环保局报告纾缓措施实施情况 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 立即通报香港环保署和深圳环保局 2. 责令承建商采取必要的纾缓措施防止水质进一步恶化 3. 评估纾缓措施效果 4. 责令承建商采取进一步的纾缓措施 	同启动水平，另增加： <ol style="list-style-type: none"> 1. 如有必要，改变施工方法 2. 接工程主任通告 3 天内提交进一步的纾缓措施
极 限 水 平	与行动水平相同，另增加： <ol style="list-style-type: none"> 1. 立即向雇主、工程主任提交超标成因的调查报告及防止超标的建议 	同行动水平，另增加： <ol style="list-style-type: none"> 1. 指令承建商仔细检讨工作方法 2. 如继续超标，应责令承建商停止或放慢全部或部分施工活动或进度 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 立即采取措施避免超标继续发生 2. 检查施工方法、机械设备，并考虑改变施工方法 3. 接工程主任通告 3 天内提交更进一步的纾缓措施 4. 实施经批准的纾缓措施 5. 如超标未得到控制，再次向工程主任提交新的纾缓措施 6. 按工程主任指令放慢或停止全部（或部分）施工活动，直至超标停止

5.4.2 水下疏浚 SS 审核

本报告期承建商在桩号 12+500~12+750 段进行水下疏浚作业，环监小组按照《治理深圳河第三期工

程环境监察与审核手册》的要求实施水下疏浚水质监察。根据《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》规定，当控制点 SS 含量超过对照点 SS 含量的 30%（标准 I），且控制点的 SS 含量超过 243mg/L（标准 II）即可认为此次水质监察值超标，须启动相应的行动水平，采取相应的纾缓措施，将水下疏浚对水质的影响控制至上述水平以下。

本报告期各次水下疏浚监察均在落潮期进行，开挖点上游 500m 设水质监察对照点，下游 1,000m 设水质监察控制点。统计本报告期 8 次水下疏浚控制点超标情况，列于表 5-10（表中“-”表示未超标，“+”表示已超标）。

本报告期水质监察控制点 8 次 SS 监察结果在 13.6mg/L~53.1mg/L 之间，其中有 3 次超过了控制标准 I，但均未超过控制标准 II，因此环监小组未启动相关行动计划。

表 5-10 2006 年 07 月 III C 工程水下疏浚水质监察 SS 含量超标情况

监察日期 mm-dd	潮汐	控制点 SS 含量	对照点 SS 含量	标准 I		标准 II		本报告期超 标情况
		mg/L	mg/L	mg/L	超标情况	mg/L	超标情况	
07-05	落 潮	49.0	36.4	47.3	+	243	-	-
07-07		31.4	44.7	58.1	-	243	-	-
07-11		53.1	24.0	31.2	+	243	-	-
07-14		13.6	26.9	35.0	-	243	-	-
07-19		47.5	90.8	118	-	243	-	-
07-21		25.4	44.0	57.2	-	243	-	-
07-25		34.0	17.6	22.9	+	243	-	-
07-26		51.3	57.5	74.8	-	243	-	-

图 5-5 为水质控制点 SS 含量超标情况对照图。

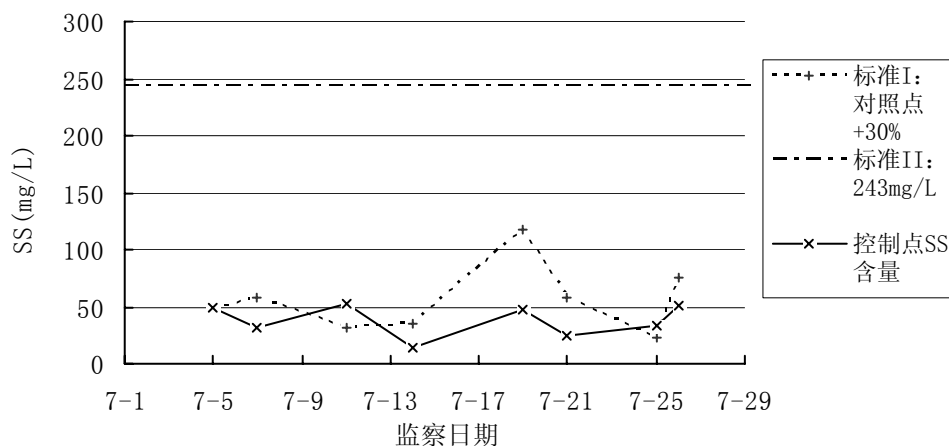


图5-5 2006年07月III C工程落潮期水下疏浚SS含量超标情况对照图

5.4.3 非污染土海上弃置转运场 SS 审核

本报告期III C工程继续进行非污染土海上弃置转运场转运作业，环监小组按照《非污染土海上弃置转运水质监测方案》的要求，实施转运场水质监察。《非污染土海上弃置转运水质监测方案》规定，当控制点SS含量超过对照点SS含量的30%，即认为超过控制标准，此时须复查监测数据、识别影响源、判断是否因工程施工所致，或采取相应行动计划及纾缓措施，将转运场施工对水质的影响控制在水平规限内。

每周1天的非污染土海上弃置转运场短周期水质监察于涨潮期和落潮期各进行1次。本报告期4天非污染土海上弃置转运场短周期水质控制监察点SS超标情况统计，列于表5-11，表中“-”表示未超标，“+”表示已超标。

本报告期非污染土海上弃置转运场水质监察控制点4天SS监察结果在14.2mg/L~47.8mg/L之间，涨潮期和落潮期均未超过控制标准。

表 5-11 2006年07月III C工程非污染土海上弃置转运场水质监察SS含量超标情况

监察日期	潮汐	控制点SS含量	对照点SS含量	控制标准	超标情况
mm-dd		mg/L	mg/L	mg/L	
07-06	涨潮	42.3	48.9	63.6	-
07-13		22.7	25.3	32.9	-
07-20		42.4	41.1	53.4	-
07-28		20.9	19.7	25.6	-
07-06	落潮	47.8	43.2	56.2	-
07-13		42.1	41.0	53.3	-
07-20		24.5	27.8	36.1	-
07-28		14.2	17.9	23.3	-

非污染土海上弃置转运场水质控制点SS含量超标情况，见图5-6和图5-7。

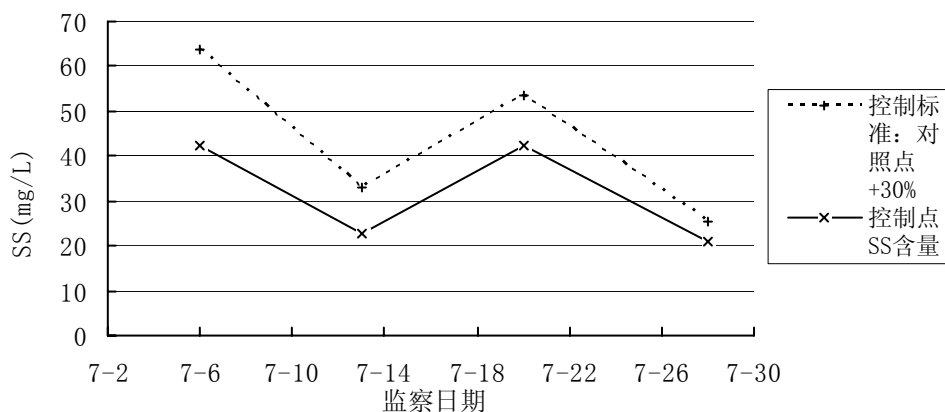


图5-6 2006年07月III C工程转运场涨潮期水质监察SS含量超标情况对照图

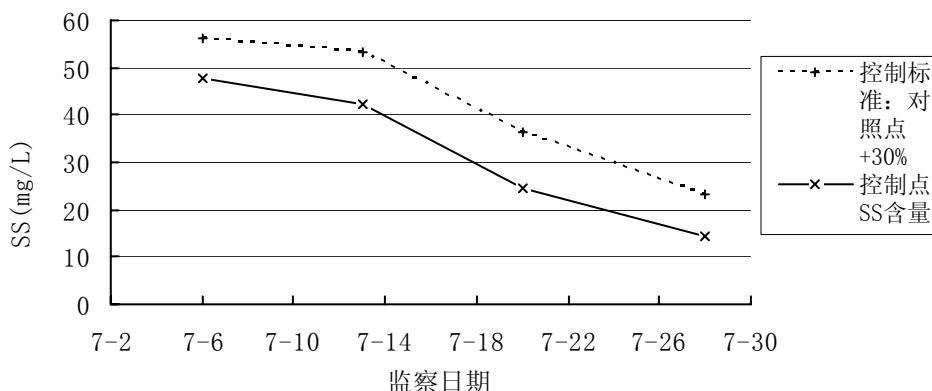


图5-7 2006年07月III C工程转运场落潮期水质监察SS含量超标情况对照图

5.4.4 深圳河水质状况

SS

本报告期平原河口水质监察点涨潮期和落潮期 SS 值分别为 5.72mg/L 和 33.3mg/L，文锦渡水质监察点涨潮期和落潮期 SS 值分别为 15.6mg/L 和 14.4mg/L，对比这两个监察点的 SS 含量，涨潮期文锦渡水质监察点比平原河口水质监察点增加了 172%，落潮期文锦渡水质监察点比平原河口水质监察点减少了 56.8%。

与上一个报告期相比，平原河口水质监察点涨潮期 SS 含量由 49.1mg/L 下降至 5.72mg/L，落潮期 SS 含量由 106mg/L 下降至 33.3mg/L；文锦渡水质监察点涨潮期 SS 含量由 36.8mg/L 下降至 15.6mg/L，落潮期由 37.0mg/L 下降至 14.4mg/L。

本报告期深圳河鹿丹村固定水质监察点和深圳河口永久水质监察点 SS 含量在 33.2~92.7mg/L 之间，最大值出现在深圳河口水质监察点涨潮期，最小值出现在鹿丹村水质监察点落潮期。与上一个报告期相比，鹿丹村水质监察点涨潮期 SS 含量由 75.8mg/L 下降为 49.2mg/L，落潮期由 34.0mg/L 下降至 33.2mg/L；深圳河口水质监察点 SS 含量涨潮期由 35.3mg/L 上升至 92.7mg/L，落潮期由 22.1mg/L 上升至 79.8mg/L。

其它主要水质参数

本报告期深圳河水质有所好转，溶解氧（DO）含量在平原河水水质监察点涨潮期为 2.91mg/L，落潮期为 4.38mg/L；在文锦渡水质监察点涨潮期为 2.27mg/L，落潮期为 2.63mg/L；在鹿丹村水质监察点涨潮期为 1.86mg/L，落潮期为 1.62mg/L；在深圳河口水质监察点涨潮期为 4.47mg/L，落潮期为 4.05mg/L。

与上一报告期相比较，本报告期鹿丹村水质监察点主要水质参数涨潮期和落潮期平均值变化如下：BOD₅ 由 17.2mg/L 上升为 33.0mg/L；氨氮由 16.3mg/L 下降至 13.2mg/L；总氮由 20.3mg/L 下降至 18.7mg/L；总磷由 1.13mg/L 上升为 1.68mg/L；总铜由 18.4μg/L 上升为 22.4μg/L。

与上一个报告期相比，本报告期深圳河口水质监察点主要水质参数涨潮期和落潮期平均值变化如下：BOD₅ 由 2.85mg/L 上升为 9.70mg/L；氨氮由 12.2mg/L 下降至 5.90mg/L；总氮由 14.8mg/L 下降至 6.67mg/L；总磷由 0.53mg/L 上升为 0.79mg/L；总铜由 4.2μg/L 上升为 19.1μg/L。

本报告期 SS 值和其它主要水质参数监察结果及沿程变化见图 5-8。

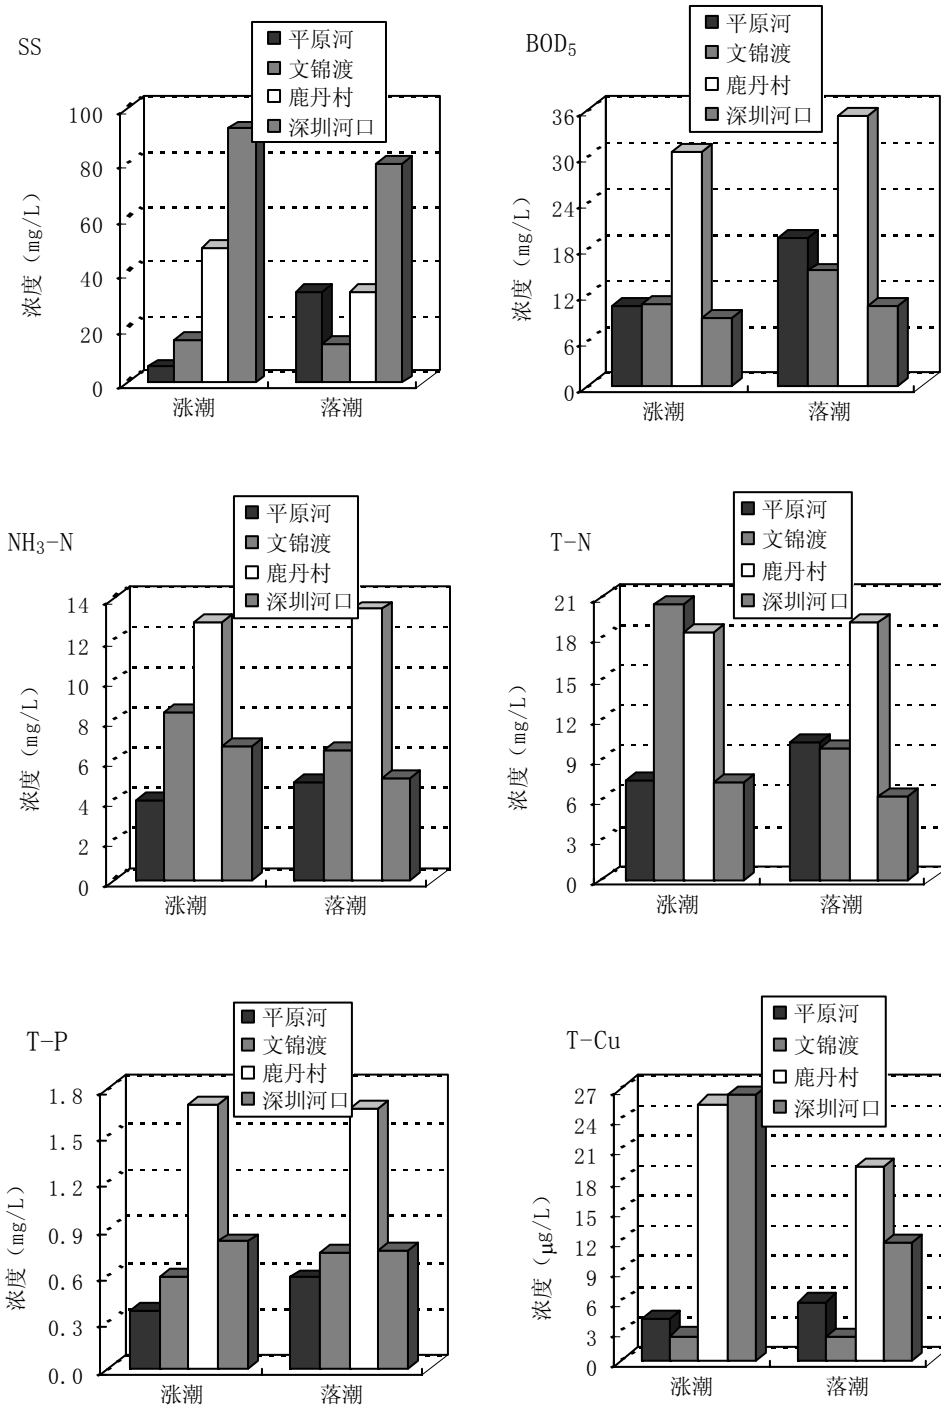


图 5-8 2006 年 07 月 14 日深圳河水质沿程变化图

5.4.5 深圳河水质变化趋势分析

三期工程水质监察控制点鹿丹村监察点和深圳河口永久水质监察点在过去 4 个报告期内主要水质参数监察结果列于表 5-12。

表 5-12 2006 年 4 月~7 月鹿丹村和深圳河口水质监察点主要水质参数监察结果

监察点位	监察月份	SS		DO		BOD ₅		氨氮		总氮		总磷		总铜			
		mg/L														μg/L	
		涨潮	落潮	涨潮	落潮	涨潮	落潮	涨潮	落潮	涨潮	落潮	涨潮	落潮	涨潮	落潮	涨潮	落潮
鹿丹村	06 年 04 月	111	61.8	0.87	0.24	40.2	36.4	24.2	24.5	26.1	25.3	2.23	2.15	47.1	25.4		
	06 年 05 月	45.3	54.7	0.14	0.16	42.4	36.9	23.1	17.1	25.1	20.8	1.77	1.76	19.6	15.1		
	06 年 06 月	75.8	34.0	0.35	0.28	15.2	19.1	16.7	16.0	20.4	20.1	1.04	1.22	25.4	11.4		
	06 年 07 月	49.2	33.2	1.86	1.62	30.6	35.3	12.9	13.5	18.4	19.1	1.70	1.67	25.5	19.3		
深圳河口	06 年 04 月	22.2	25.4	2.65	3.78	5.9	5.7	8.7	7.7	9.2	9.0	0.90	0.82	5.1	6.1		
	06 年 05 月	42.8	36.6	0.19	3.62	20.4	7.4	6.2	6.1	16.9	11.1	1.79	0.85	12.7	4.2		
	06 年 06 月	35.3	22.1	1.10	1.89	3.0	2.7	12.0	12.3	14.3	15.3	0.54	0.52	5.2	3.1		
	06 年 07 月	92.7	79.8	4.47	4.05	8.9	10.5	6.7	5.1	7.2	6.2	0.82	0.76	26.4	11.8		

SS 含量

鹿丹村固定水质监察点涨潮期 SS 含量在过去 4 个报告期呈起伏变化，5 月份以较大幅度下降，6 月份出现小幅度回升，7 月份又有小幅度下降；落潮期 SS 含量在过去 4 个报告期则继续保持下降趋势，5 月份小幅下降，6 月份下降速度有所增加，本报告期下降幅度甚微。鹿丹村固定水质监察点 2006 年 4 月至 2006 年 7 月 SS 值变化趋势见图 5-9。

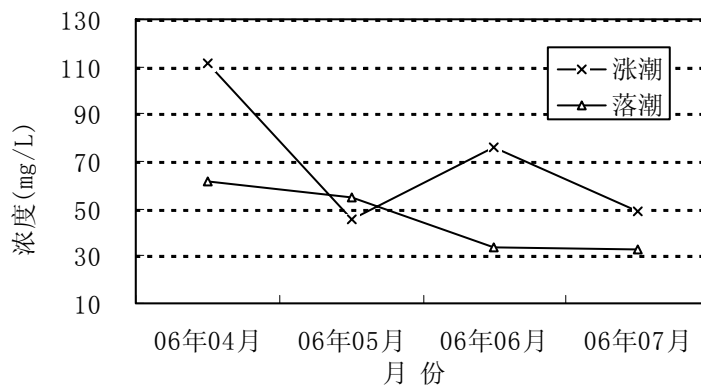


图5-9 深圳河鹿丹村监察点 (M1) SS变化趋势图

深圳河河口固定水质监察点涨潮期 SS 含量在 5 月份以小幅度上升，6 月份有所下降，本报告期则大幅度上升；落潮期 SS 含量变化趋势与涨潮期相似。深圳河河口固定水质监察点 2006 年 4 月至 2006 年 7 月 SS 值的变化趋势见图 5-10。

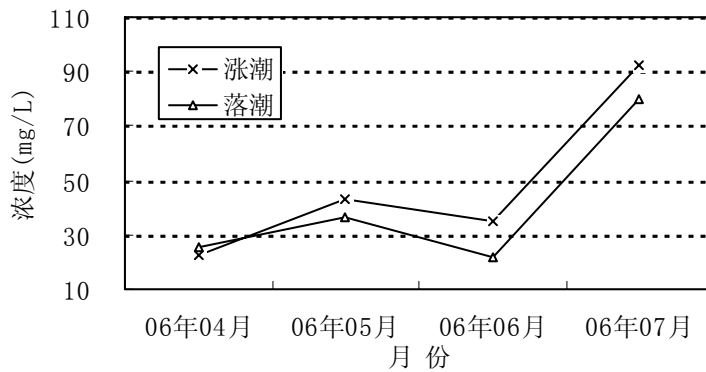


图5-10 深圳河河口监察点(M11) SS变化趋势图

其它主要水质参数

图 5-11~图 5-16 分别为鹿丹村水质监察点 DO、BOD₅、氨氮、总氮、总磷和总铜含量在过去 4 个报告期的变化情况。

在过去 4 个报告期内，鹿丹村监察点涨潮期 DO 含量 5 月份有较大幅度的下降，6 月份出现小幅上升，本报告期大幅度上升至过去 4 个报告期的最大值；落潮期 DO 含量 5 月份下降趋势明显减缓，6 月份表现出上升趋势，本报告期亦大幅度上升至过去 4 个报告期的最大值。涨潮期和落潮期 BOD₅ 含量变化趋势基本相似，5 月份略有上升，6 月份大幅度下降，本报告期则有较大幅度回升。涨潮期氨氮含量 5 月份开始小幅度下降，6 月份转变为大幅度下降，本报告期下降幅度有所降低；落潮期氨氮含量 5 月份有大幅度下降，6 月份下降速度明显减缓，本报告期下降速度略大于上月。涨潮期和落潮期总氮含量变化与涨潮期和落潮期氨氮含量变化趋势相似。涨潮期和落潮期总磷含量变化相似，5 月份和 6 月份均连续以较大幅度下降，达到过去 4 个报告期的最小值，本报告期同时有较大幅度的回升。涨潮期总铜含量 5 月份以大幅度下降，6 月份出现小幅度回升，本报告期上升幅度不明显；落潮期总铜含量 5 月和 6 月持续以较大幅度下降，本报告期则有较大幅度的回升。

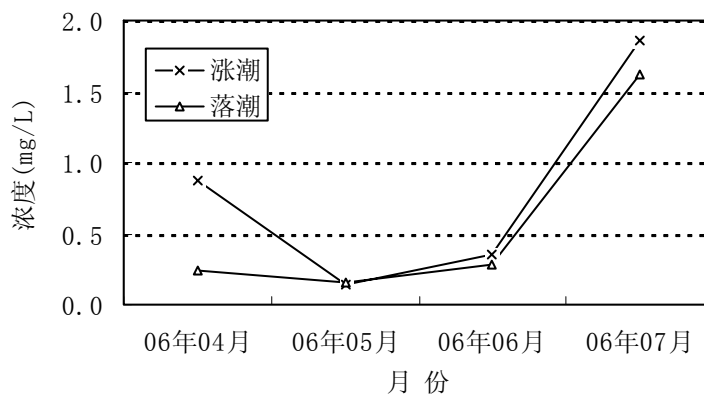


图5-11 深圳河鹿丹村监察点(M1) DO变化趋势图

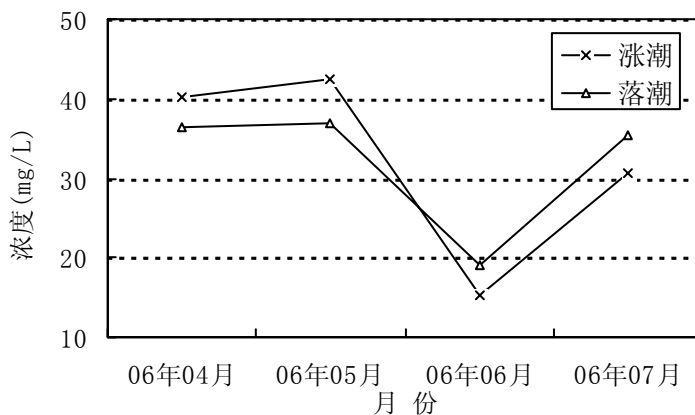


图5-12 深圳河鹿丹村监察点(MI) BOD₅变化趋势图

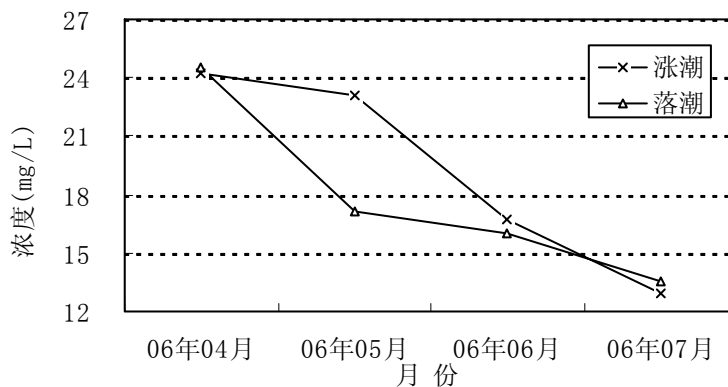


图5-13 深圳河鹿丹村监察点(MI) 氨氮变化趋势图

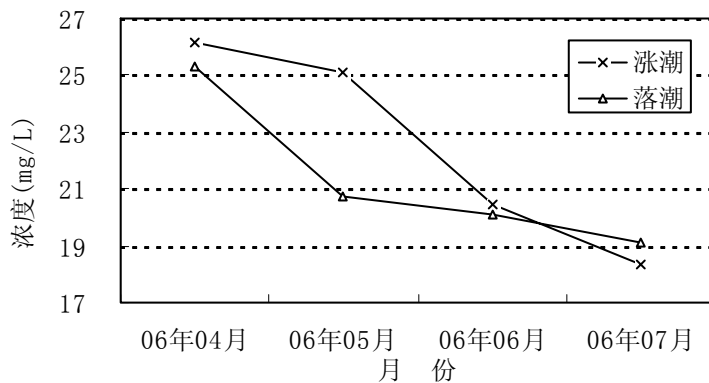


图5-14 深圳河鹿丹村监察点(MI) 总氮变化趋势图

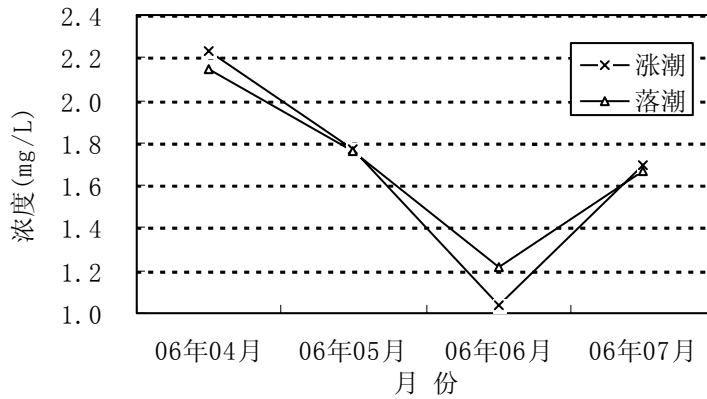


图5-15 深圳河鹿丹村监察点(MI)总磷变化趋势图

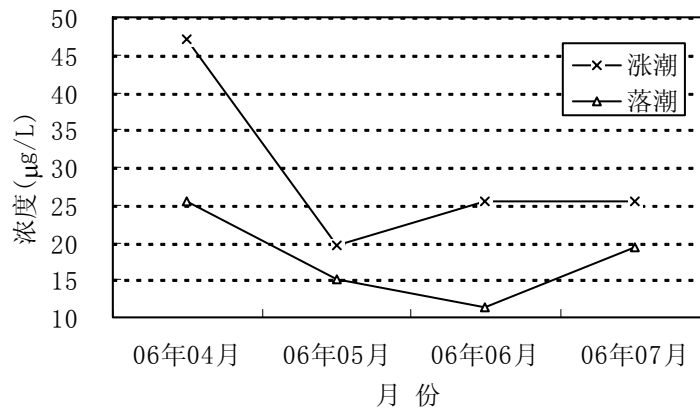


图5-16 深圳河鹿丹村监察点(MI)总铜变化趋势图

图 5-17~图 5-22 为深圳河河口监察点 (MII) 的 DO、BOD₅、氨氮、总氮、总磷和总铜含量在过去 4 个报告期的变化情况。

在过去 4 个报告期，深圳河河口监察点涨潮期 DO 含量 5 月份有大幅度下降，6 月份开始小幅上升，本报告期大幅度上升至过去 4 个报告期的最大值；落潮期 DO 含量 5 月份略有下降，6 月份下降幅度较大，本报告期则以较大幅度上升。涨潮期 BOD₅ 含量变化明显，5 月份大幅度上升至过去 4 个报告期的最高水平，6 月份又大幅度下降至过去 4 个报告期的最低水平，本报告期有较大幅度回升；落潮期 BOD₅ 含量呈起伏变化，5 月份微升，6 月份小幅度下降，本报告期又以较大幅度上升。涨潮期和落潮期氨氮含量变化基本同步，5 月份小幅度下降，6 月份大幅度上升，本报告期大幅度下降。涨潮期总氮含量 5 月份大幅度上升至过去 4 个报告期的最大值，6 月份开始下降，本报告期大幅度下降至过去 4 个报告期的最小值；落潮期总氮含量 5 月份以小幅度上升，6 月份上升幅度增大，本报告期大幅度下降。涨潮期总磷含量 5 月份大幅度上升，达到过去 4 个报告期的最大值，6 月份则大幅度下降，达到过去 4 个报告期的最小值，本报告期小幅度回升；落潮期总磷含量 5 月份略有上升，6 月份小幅度下降，本报告期又小幅度回升。涨潮期总铜含量 5 月份有较大幅度上升，6 月份则以较大幅度下降，本报告期大幅度上升至过去 4 个报告期的最大值；落潮期总铜含量载连续两个月的小幅下降后，本报告期出现较大幅度的上升。

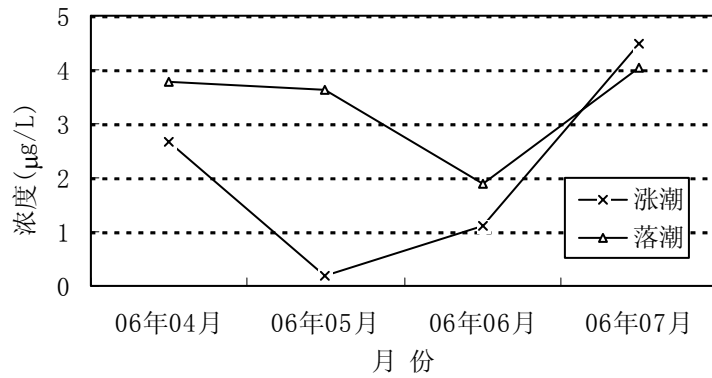


图5-17 深圳河河口监察点(MII) DO变化趋势图

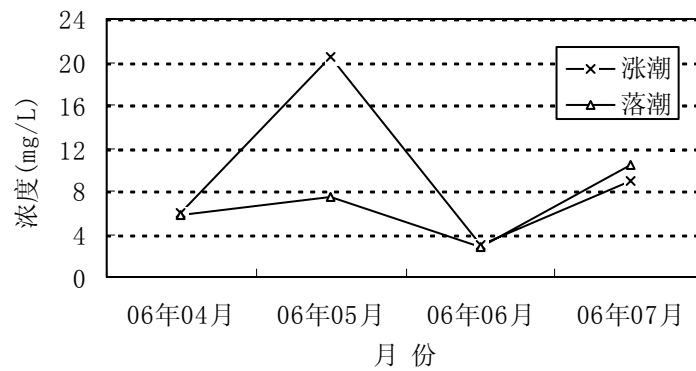


图5-18 深圳河河口监察点(MII) BOD₅变化趋势图

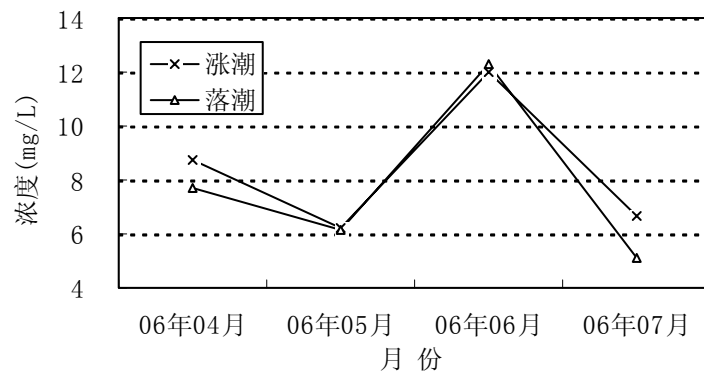


图5-19 深圳河河口监察点(MII) 氨氮变化趋势图

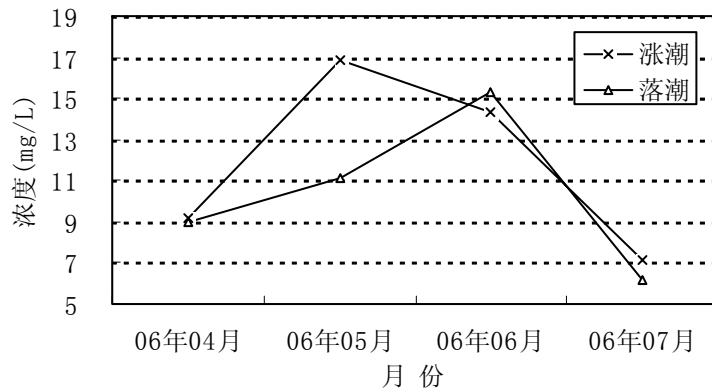


图5-20 深圳河河口监察点(M11)总氮变化趋势图

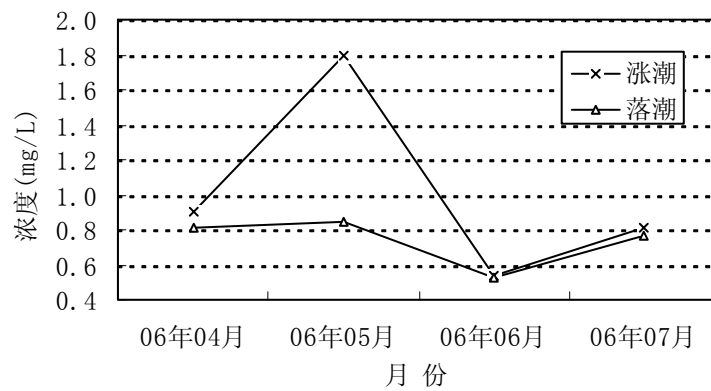


图5-21 深圳河河口监察点(M11)总磷变化趋势图

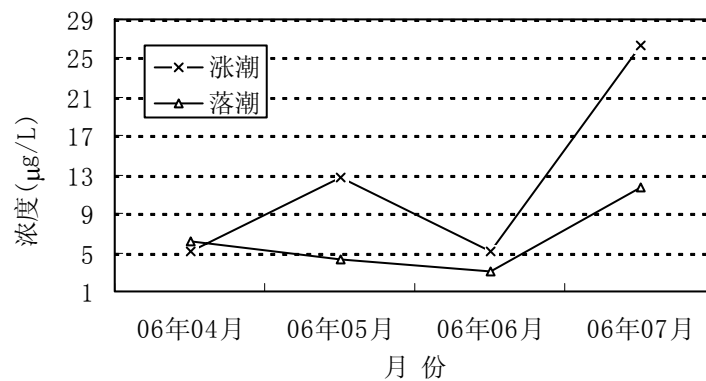


图5-22 深圳河河口监察点(M11)总铜变化趋势图

6 结论与建议

本报告期受“碧利斯”和“格美”台风影响，阴雨天气频繁出现，对抑制施工扬尘、降低空气中粉尘含量起到积极作用，本报告期 III C 工程陆上施工作业强度较轻，工区起尘现象较少。本报告期深圳侧空气监察点的空气污染水平较上一个报告期有所下降，香港侧两个空气监察点的空气污染水平较上一个报告期略有上升，但仍均处于很低的污染水平，总体而言，本报告期 III C 施工区环境空气质量状况良好。

本报告期 III C 工程段噪音源主要为河道水下疏浚开挖、河道防护工程施工作业施工机械、车辆和船舶噪音，对区域声环境产生一定干扰。由于 III C 工区施工场地开阔、机械使用分散、以及两岸已完建河堤的屏障作用，施工噪音对大部分区域声环境未造成干扰；在沙湾河口及下游施工场区，由于承建商加强了施工管理和噪音控制，本报告期噪音污染程度有所降低，对附近深圳侧居民正常生活未造成较大干扰。本报告期 III C 工区深圳侧华侨新村噪音监察点噪音污染水平较上一个报告期有所下降，香港侧两个噪音敏感点的噪音污染水平较上一个报告期均有所上升，但噪音污染水平很低。本报告期环监小组接到 1 起有关 III C 工程深圳侧工地施工噪音扰民投诉，环监小组按《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》规定，采取了相应的行动计划。环监小组及时通知、并督促承建商，采取相应的措施减轻噪音污染，严格控制施工强度和作业时间，加强施工机械、船舶和车辆的维护和管理。在雇主及环监小组的督促管理以及承建商的积极措施防治下，噪音扰民情况较上一个报告期有较大程度的减轻。

本报告期承建商继续在 III C 工程河段进行水下疏浚开挖，水下疏浚施工扰动对深圳河局部水体水质产生一定影响。本报告期 III C 河段水下疏浚水质监察控制点 8 次 SS 监察结果在 13.6mg/L~53.1mg/L 之间，有 3 次超过控制标准 I，但均未超过控制标准 II，因此环监小组未启动相关行动计划。

本报告期非污染土海上弃置转运场水质监察控制点 4 天 SS 监察结果在 14.2mg/L~47.8mg/L 之间，涨潮期和落潮期 SS 监测结果均未超过控制标准，因此环监小组未启动相关行动计划。

自进入雨季以来，阴雨天气较多，对抑制施工扬尘、降低空气中粉尘含量及净化空气起到积极作用，施工区环境空气质量较好。承建商仍需因时制宜的重视做好施工区的防尘、降尘工作，维护施工区的环境空气质量。

承建商要进一步加强管理，积极采取有效的纾缓措施，控制和减轻噪音污染，定期对施工机械、船舶和车辆进行检查和维护保养，保证施工机械设备符合环保要求；特别要加强施工管理和噪音控制，控制施工作业强度和作业时间，采取措施降低施工噪声源，规范文明施工，避免发生噪音扰民，营造一个良好的施工环境。

承建商在后续施工中，特别要加强河道、河岸土方开挖和河底防护边坡及护脚施工的进度，防止和控制水土流失的产生；要加强对水下疏浚作业开挖料的管理，合理安排物料开挖并及时进行外运，避免开挖料在河岸做长时间的临时堆放，及时运至工程主任指定的弃土场；要加强工程区内物料存放的管理，不需要的物料要及时的清理出场，要指派专人负责，对使用物料合理堆放，采取防滑、防雨和防风措施，保证物料及环境安全。

海上弃置转运场弃置转运施工要严格按照施工方案进行，继续加强弃土外运船只管理，防止运输过程中土料漏入深圳河；要合理安排施工船舶作业方式，防止船舶弃置转运施工对深圳湾水域产生影响。承建商要尽快实施转运场设施检修工作，达到环境保护要求，并做好日常维护，防止转运施工对深圳湾水域水质产生不良影响。

建议承建商加强已完建排水系统的维护，清理排水沟渠的堵塞、堆集物，保证排水系统能够充分发挥其功用，防止沟道淤积、冲淤造成水土流失。雨季雨水丰沛，造成施工道路泥泞，承建商要指派专人适时对施工道路进行维护，对抗洼、泥泞路面及时进行平整、压实，必要时增设简易排水设施，保证道路畅通，同时维护工区景观；要继续做好驶出工区车辆的冲洗工作，避免工程车辆将泥土带至市政道路，产生污染。

建议承建商加强植被恢复工程管理，对完工后的植被恢复场及时进行清理，保证种植场表土质量，利用有利季节，按施工要求及时种植合适植物。

环监小组将加强施工现场巡察和督促工作，对施工噪音扰民、河道水质和植被种植与恢复进行重点监察，随时提醒承建商做好施工环境保护工作。

7 下月工程施工与环境监察计划

7.1 下月工程施工计划

- 1) 绿化工程;
- 2) L型挡土墙施工;
- 3) 土方工程;
- 4) 排水及重配工程;
- 5) 非污染土海上转运。

7.2 下月环境监察计划

- 1) 深圳河水质监察;
- 2) 深圳河水下疏浚水质监察;
- 3) 深圳湾非污染土海上弃置转运水质监察;
- 4) 深、港两侧空气监察;
- 5) 深、港两侧噪音监察;
- 6) 香港侧工区鸟类观测;
- 7) 施工现场巡视监察;
- 8) 执行《治理深圳河第三期工程环境监察与审核手册》规定的其它监察任务。
